

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Diagnostico	27 días	lun 21/05/18	mar 26/06/18	
2		Evaluar el grado de cumplimiento de las normas a implementar	5 días	lun 21/05/18	vie 25/05/18	
3		Comparar el estado del laboratorio	1 día	lun 28/05/18	lun 28/05/18	2
4		Revisión de la infraestructura	4 días	mar 29/05/18	vie 1/06/18	3
5		Identificar requerimientos y falencias técnicas	3 días	lun 4/06/18	mié 6/06/18	4
6		Identificación de necesidades del laboratorio	3 días	jue 7/06/18	lun 11/06/18	5
7		Identificar los temas que deben ser introducidos	9 días	mar 12/06/18	vie 22/06/18	6
8		Sensibilización del personal	15 días	mar 26/06/18	lun 16/07/18	7
9		Generar apropiación del personal a cada actividad a realizar	5 días	mar 26/06/18	lun 2/07/18	
10		Realizar charlas de sensibilización	4 días	mar 3/07/18	vie 6/07/18	9
11		Capacitación en la Norma	6 días	lun 9/07/18	lun 16/07/18	10
12		Plan de trabajo	19 días	mar 17/07/18	vie 10/08/18	
13		Distribuir actividades a cada funcionario	5 días	mar 17/07/18	lun 23/07/18	11
14		Identificar las actividades	4 días	lun 13/08/18	jue 16/08/18	12

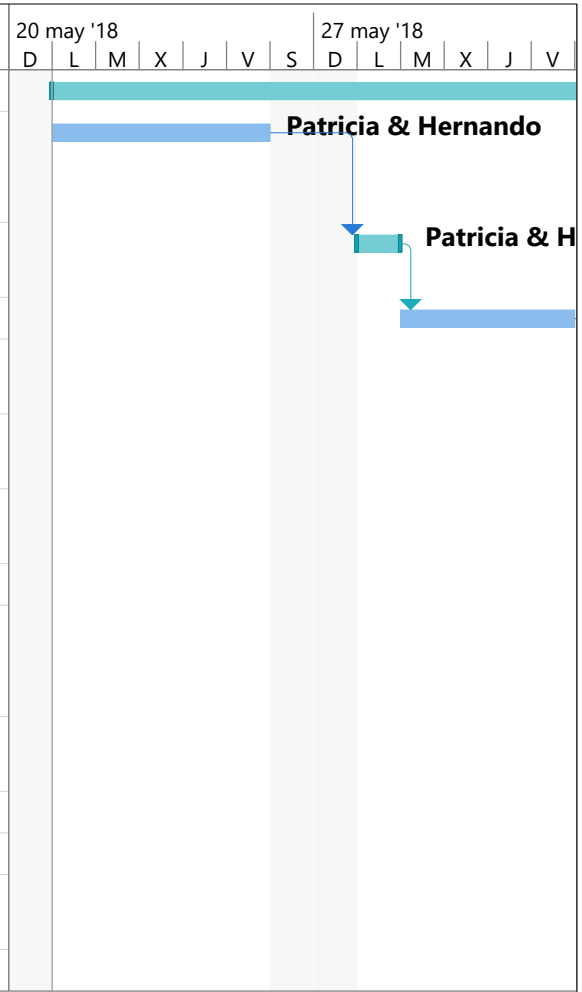

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		definir responsables	3 días	vie 17/08/18	mar 21/08/18	
16		Definir tiempos	2 días	mié 22/08/18	jue 23/08/18	
17		Adecuación de la Infraestructura	36 días	vie 24/08/18	vie 12/10/18	
18		Adecuaciones en infraestructura	15 días	vie 24/08/18	jue 13/09/18	16
19		Se ejecuta de acuerdo a la norma	3 días	vie 14/09/18	mar 18/09/18	18
20		Adecuación o reparación de los equipos u instrumentos necesarios	15 días	mié 19/09/18	mar 9/10/18	
21		Se ejecuta de acuerdo a la norma	3 días	mié 10/10/18	vie 12/10/18	
22		Estructura	20 días	mar 25/09/18	lun 22/10/18	
23		Alistar documentación	11 días	mié 19/09/18	mié 3/10/18	19
24		Realizar capacitación para el numeral 4 de la norma	3 días	mié 10/10/18	vie 12/10/18	20
25		Revisión de la documentación	3 días	lun 15/10/18	mié 17/10/18	21
26		Aprobación y divulgación de los documentos	1 día	mar 23/10/18	mar 23/10/18	22
27		Estandarización y documentación	20 días	mié 24/10/18	mar 20/11/18	
28		Documentación de las actividade	2 días	mié 24/10/18	jue 25/10/18	
29		Realizar capacitación para el num	3 días	jue 25/10/18	lun 29/10/18	
30		Levantamiento de documentació	3 días	mar 30/10/18	jue 1/11/18	



Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
31		Revisión y Aprobación de la docu	4 días	vie 2/11/18	mié 7/11/18	
32		Validación de los resultados	2 días	jue 8/11/18	vie 9/11/18	
33		Realizar planeación	3 días	lun 12/11/18	mié 14/11/18	
34		Documentar los resultados	3 días	jue 15/11/18	lun 19/11/18	
35		Manual de Calidad	15 días	mar 20/11/18	lun 10/12/18	
36		Consolidación del manual de cali	2 días	mar 20/11/18	mié 21/11/18	
37		Consolidar el manual de calidad	1 día	jue 22/11/18	jue 22/11/18	36
38		Revisión del manual de calidad	2 días	vie 23/11/18	lun 26/11/18	37
39		Aprobación del manual de Calida	1 día	mar 27/11/18	mar 27/11/18	38
40		Divulgación del Manual de Calida	1 día	mié 28/11/18	mié 28/11/18	39
41		Evidencia	10 días	lun 3/12/18	vie 14/12/18	
42		Puesta en funcionamiento	3 días	lun 3/12/18	mié 5/12/18	
43		Emplear el sistema de gestión de	5 días	jue 6/12/18	mié 12/12/18	42
44		Seguimiento	19 días	jue 13/12/18	mar 8/01/19	
45		Eficiencia y eficacia del sistema d	10 días	mié 9/01/19	mar 22/01/19	44
46		Medición de la satisfacción	2 días	mié 9/01/19	jue 10/01/19	
47		Seguimiento a indicadores	10 días	vie 11/01/19	jue 24/01/19	46
48		Auditoria interna	2 días	vie 25/01/19	lun 28/01/19	47
49		Formulaciones correctivas	2 días	mar 29/01/19	mié 30/01/19	48
50		Revisión por dirección	1 día	lun 4/02/19	lun 4/02/19	
51		Evaluación de la eficiencia y efica	1 día	mar 5/02/19	mar 5/02/19	
52		Autorización	8 días	jue 7/02/19	lun 18/02/19	
53		Aprobación por dirección	2 días	mié 20/02/19	jue 21/02/19	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
54		Revisión de los resultados	5 días	lun 25/02/19	vie 1/03/19	
55		Gestión de la acreditación del lab	34 días	lun 11/03/19	jue 25/04/19	
56		Certificar el sistema de gestión	34 días	lun 11/03/19	jue 25/04/19	
57		Compra de póliza	1 día	lun 11/03/19	lun 11/03/19	
58		Solicitud y pago para la auditoria	3 días	mié 13/03/19	vie 15/03/19	
59		Auditoria para la acreditación	4 días	lun 18/03/19	jue 21/03/19	
60		Elaborar plan de acción para corr	4 días	lun 25/03/19	jue 28/03/19	
61		Verificación del plan de eficacia	3 días	vie 29/03/19	mar 2/04/19	
62		Otorgamiento de la acreditación	9 días	lun 15/04/19	jue 25/04/19	
63						


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

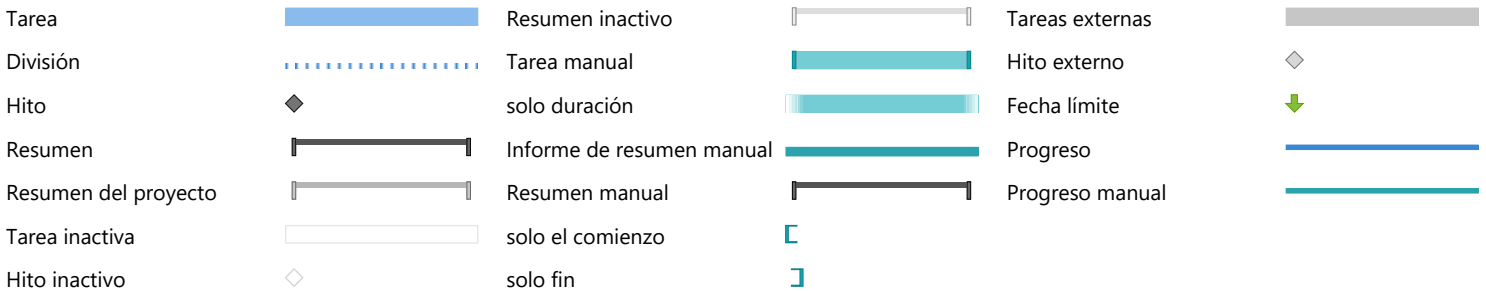

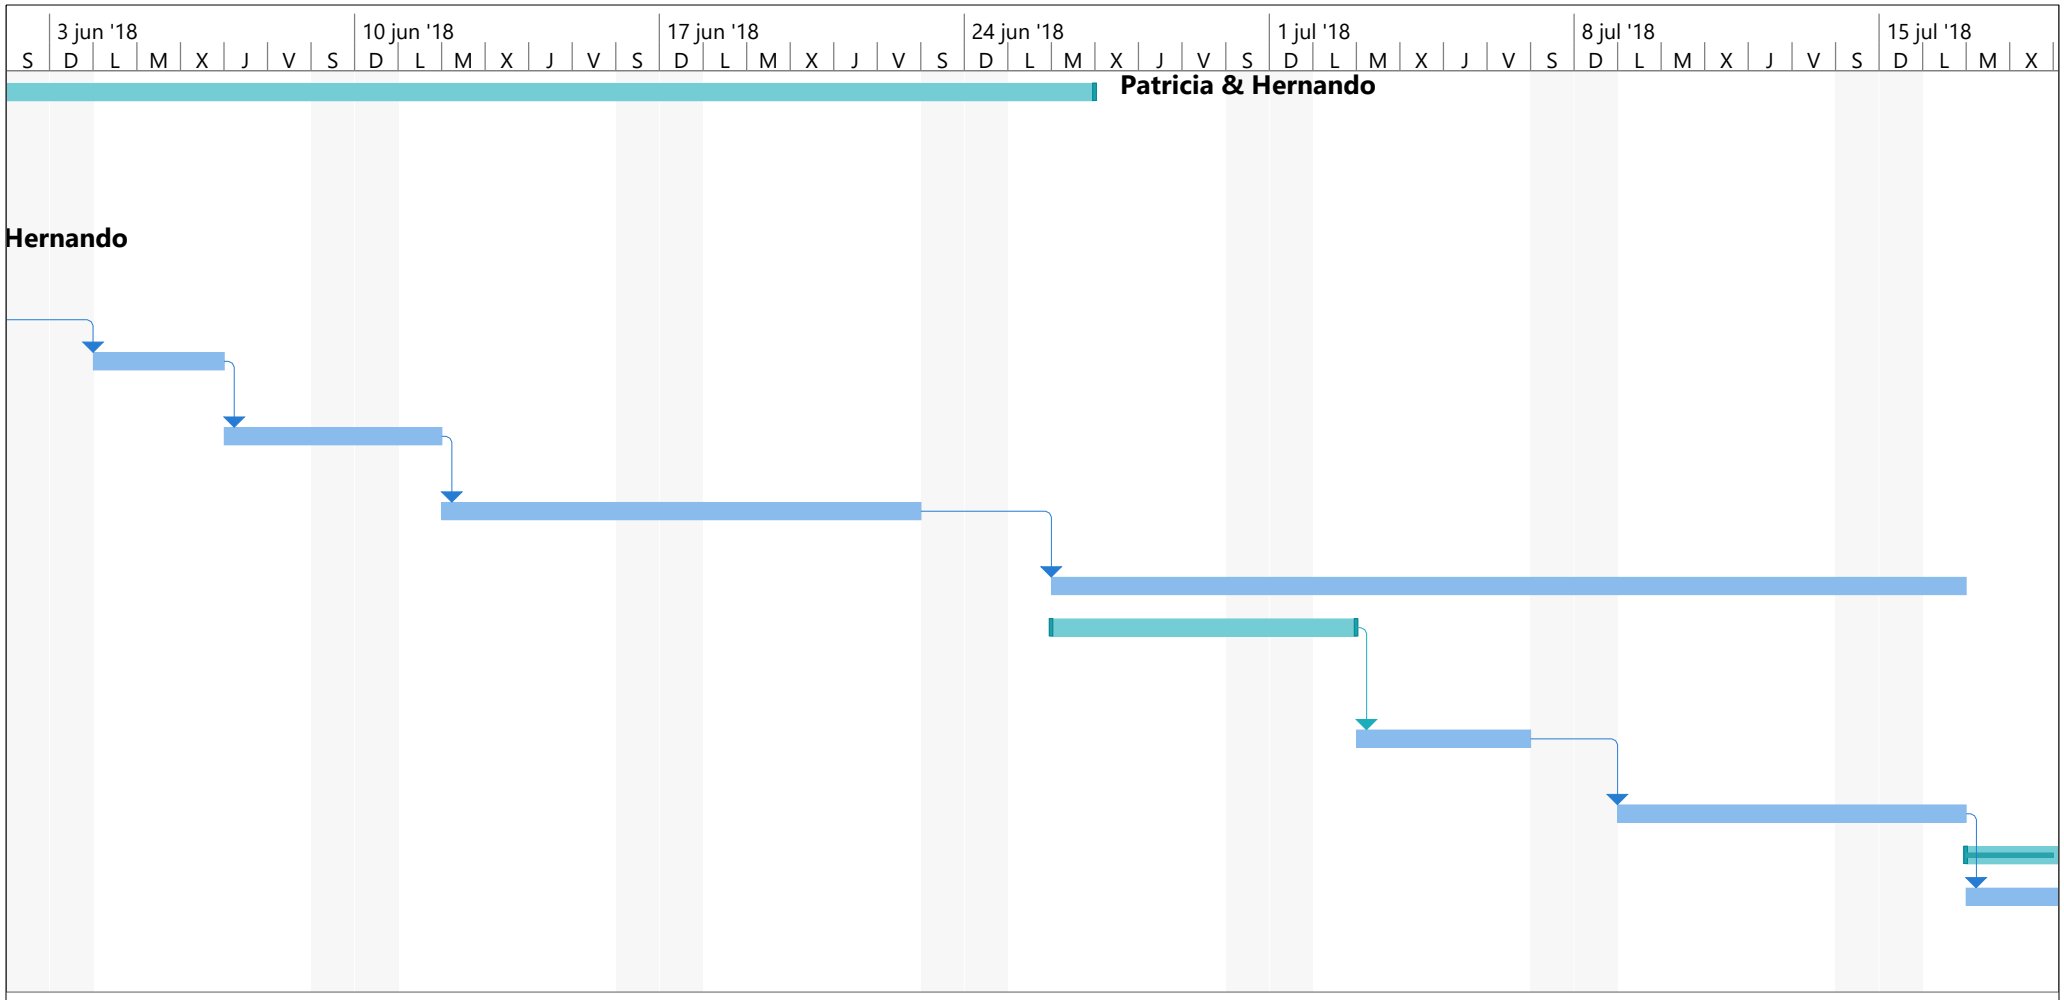


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

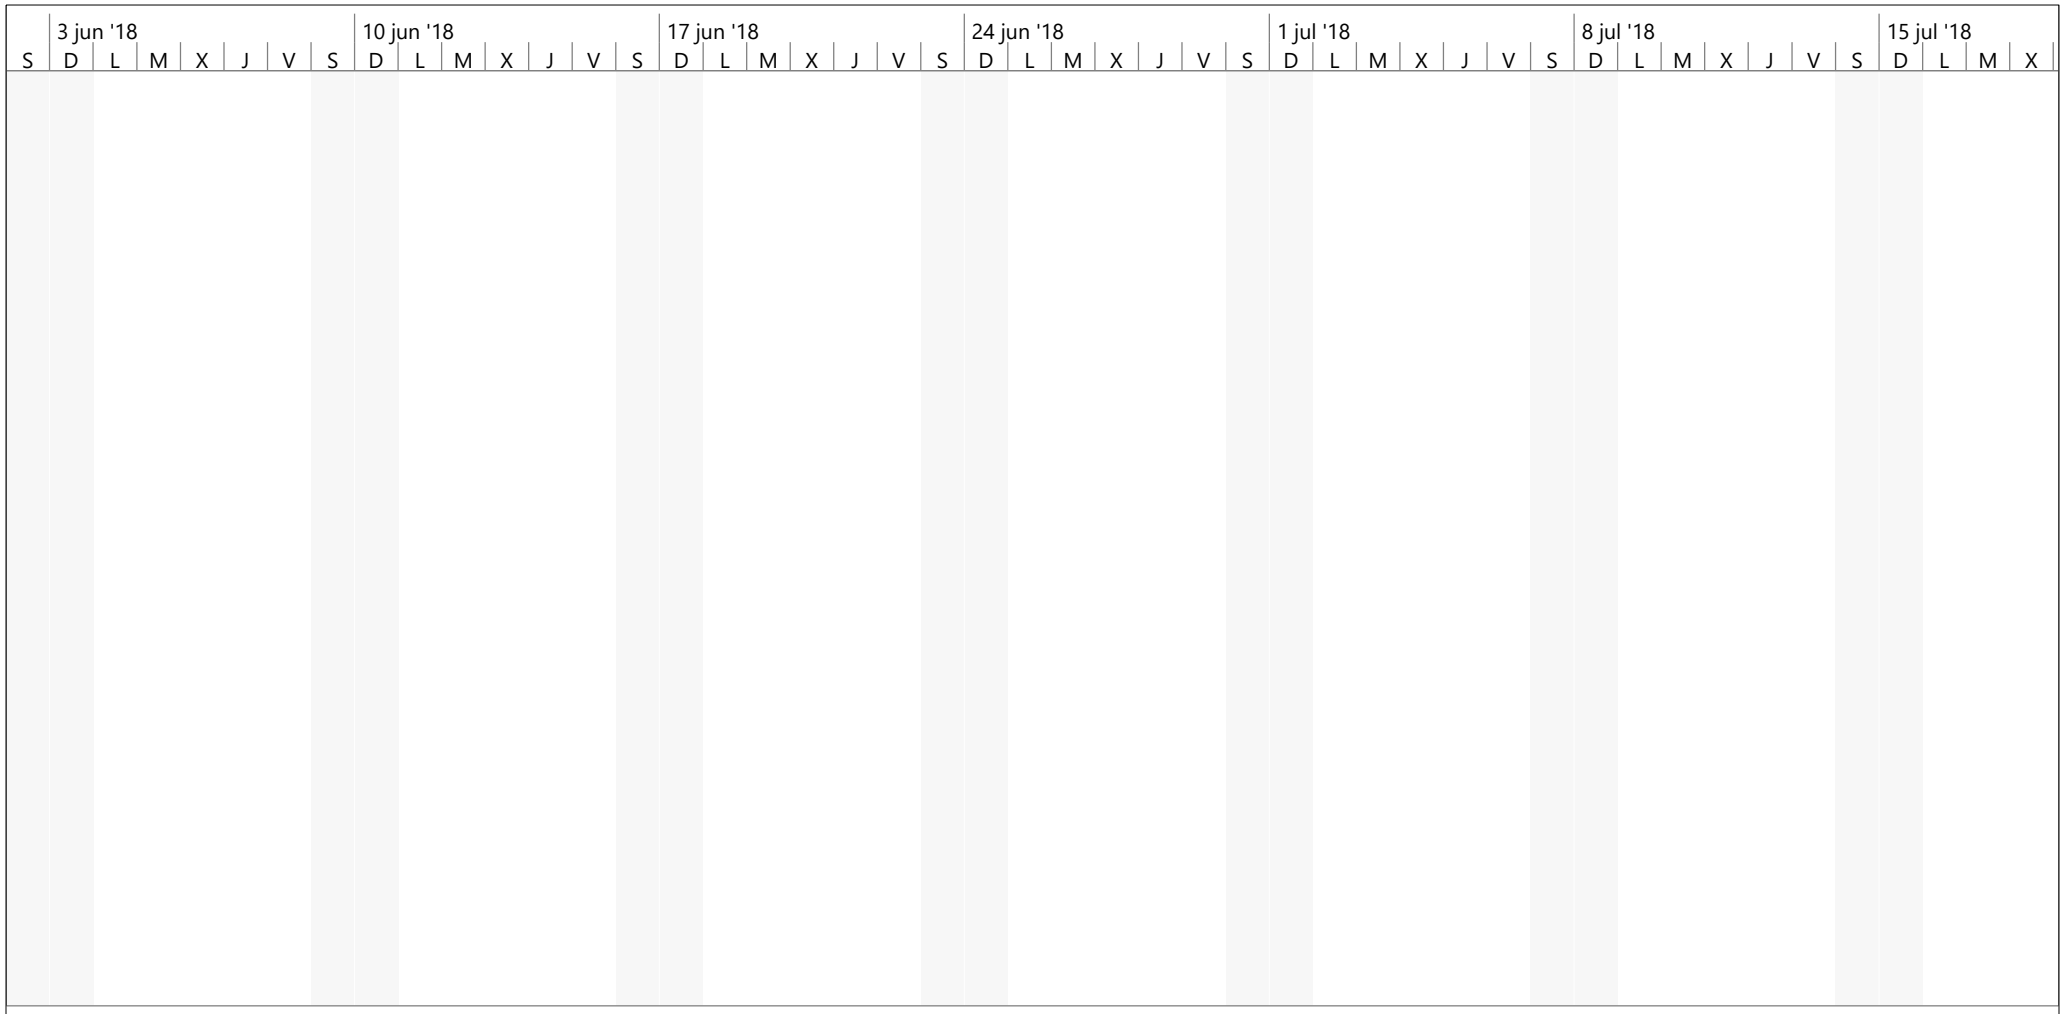


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

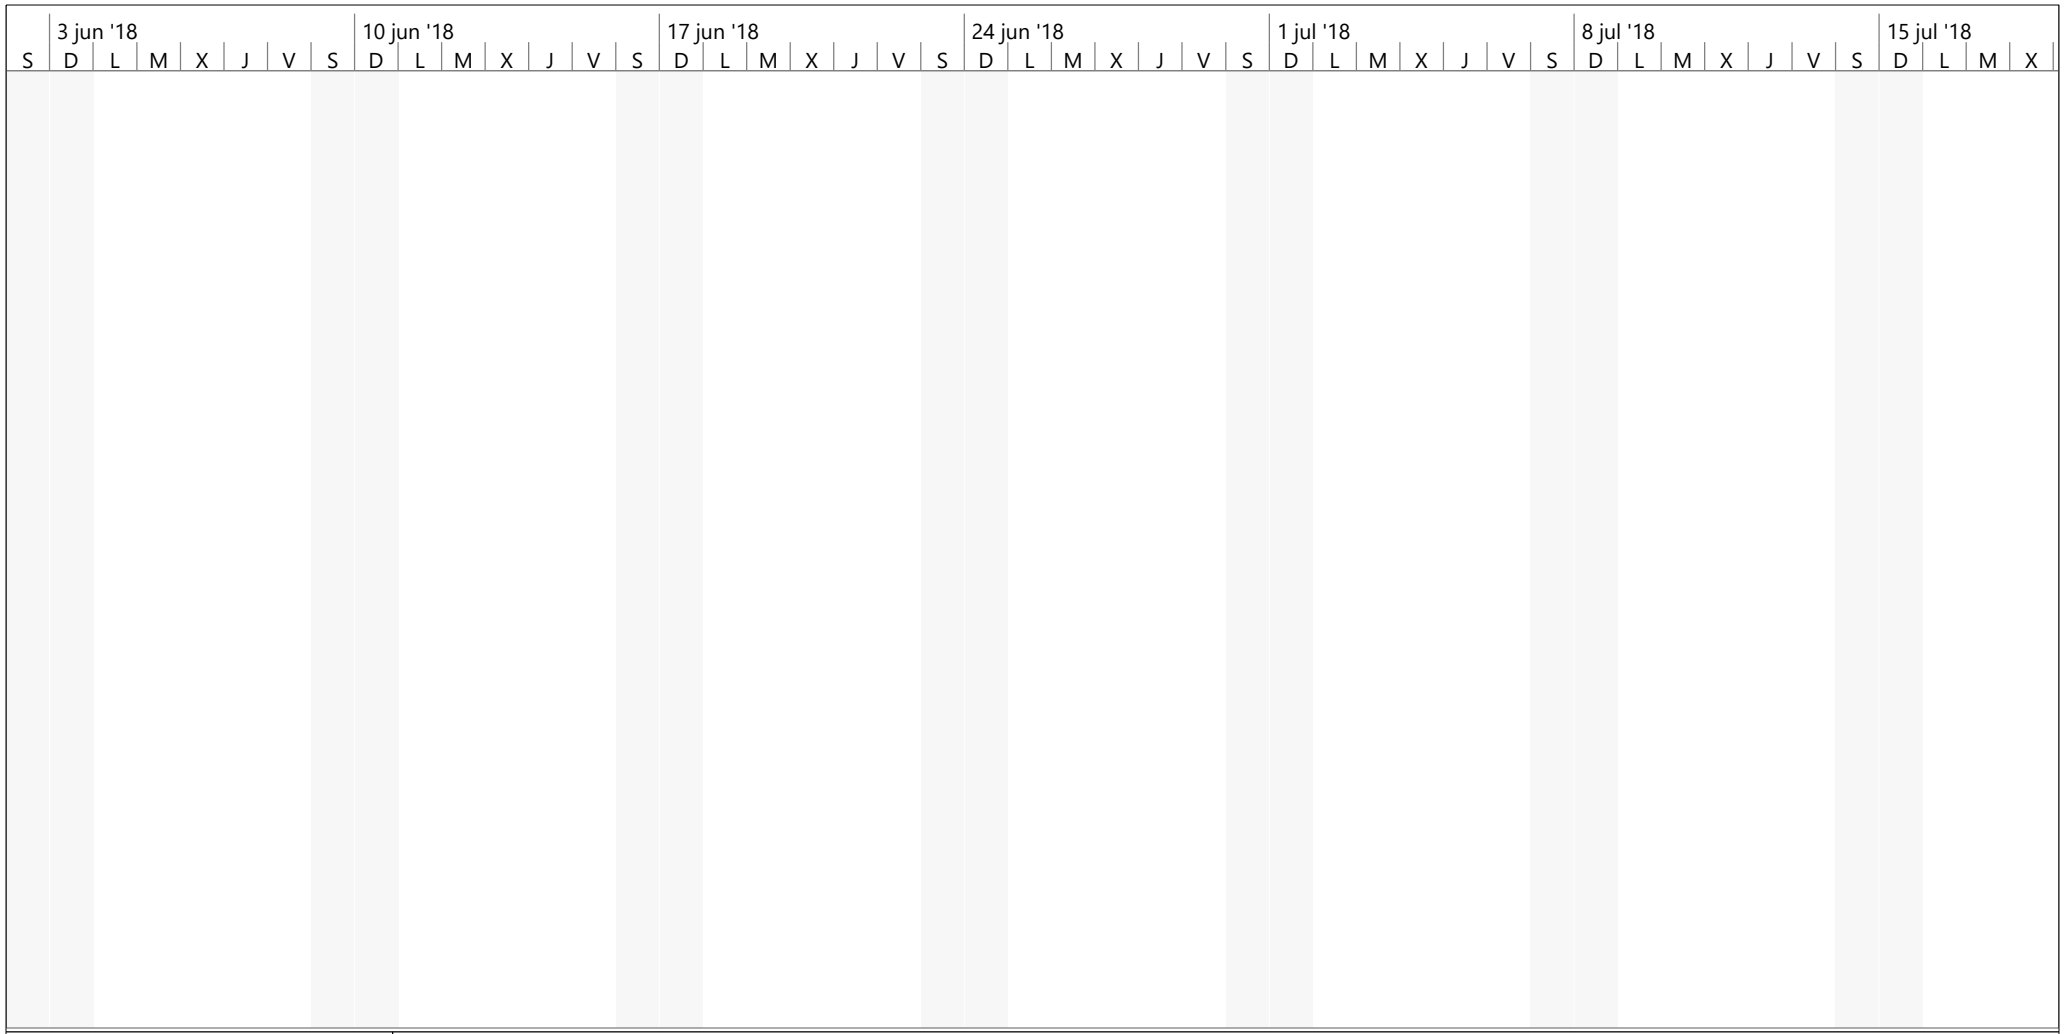


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

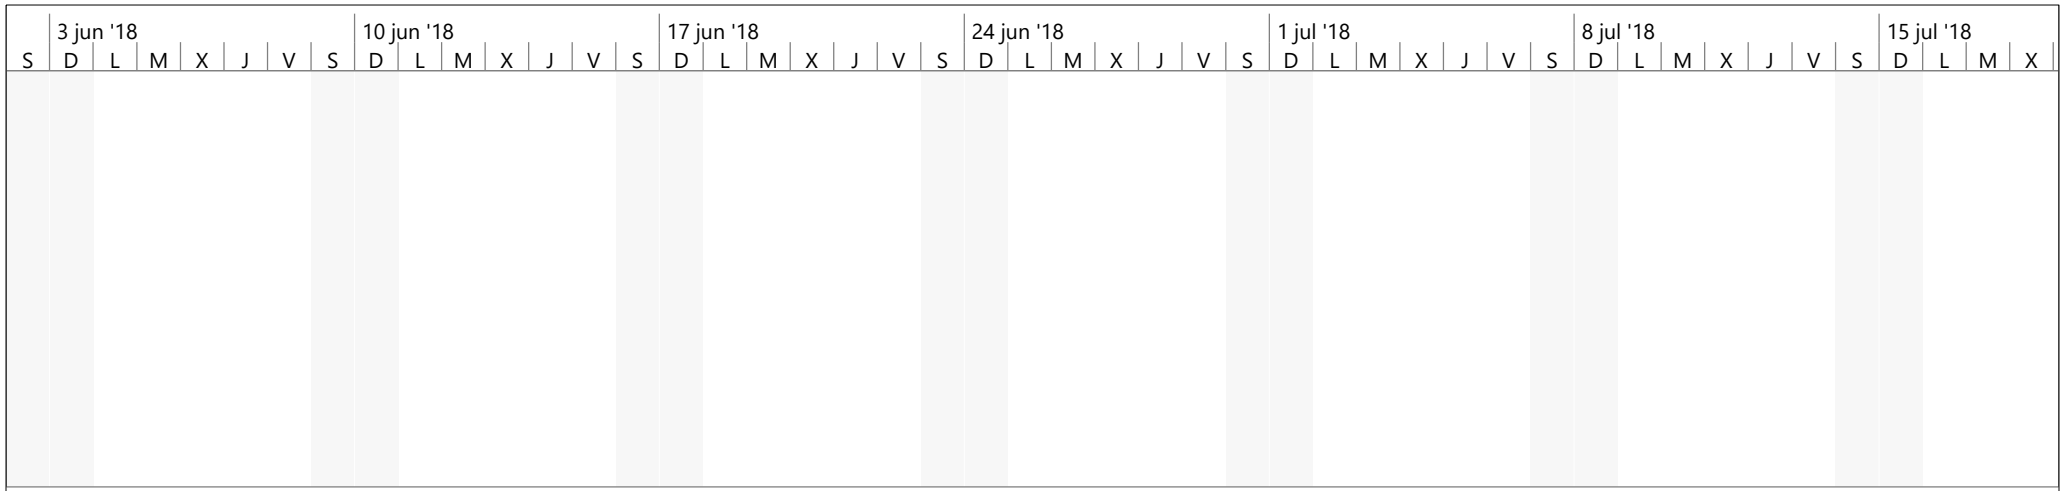


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

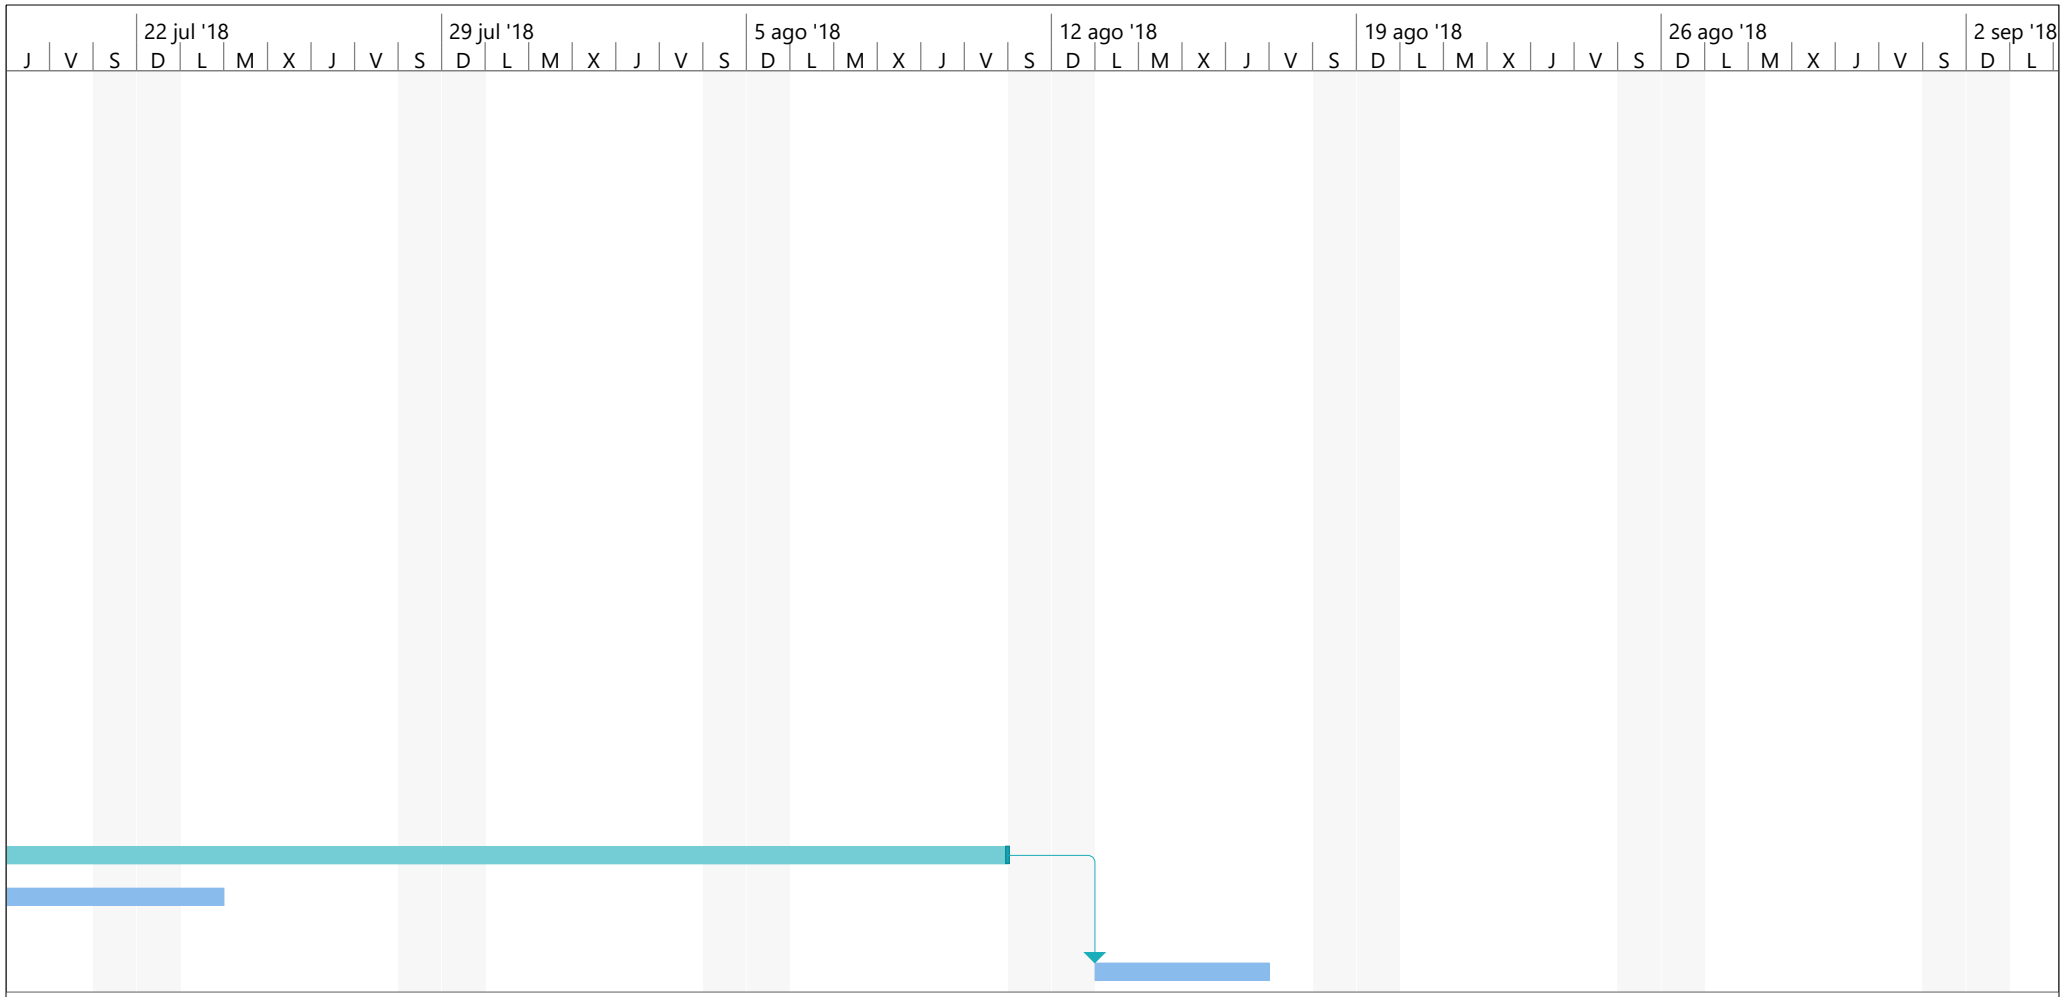


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

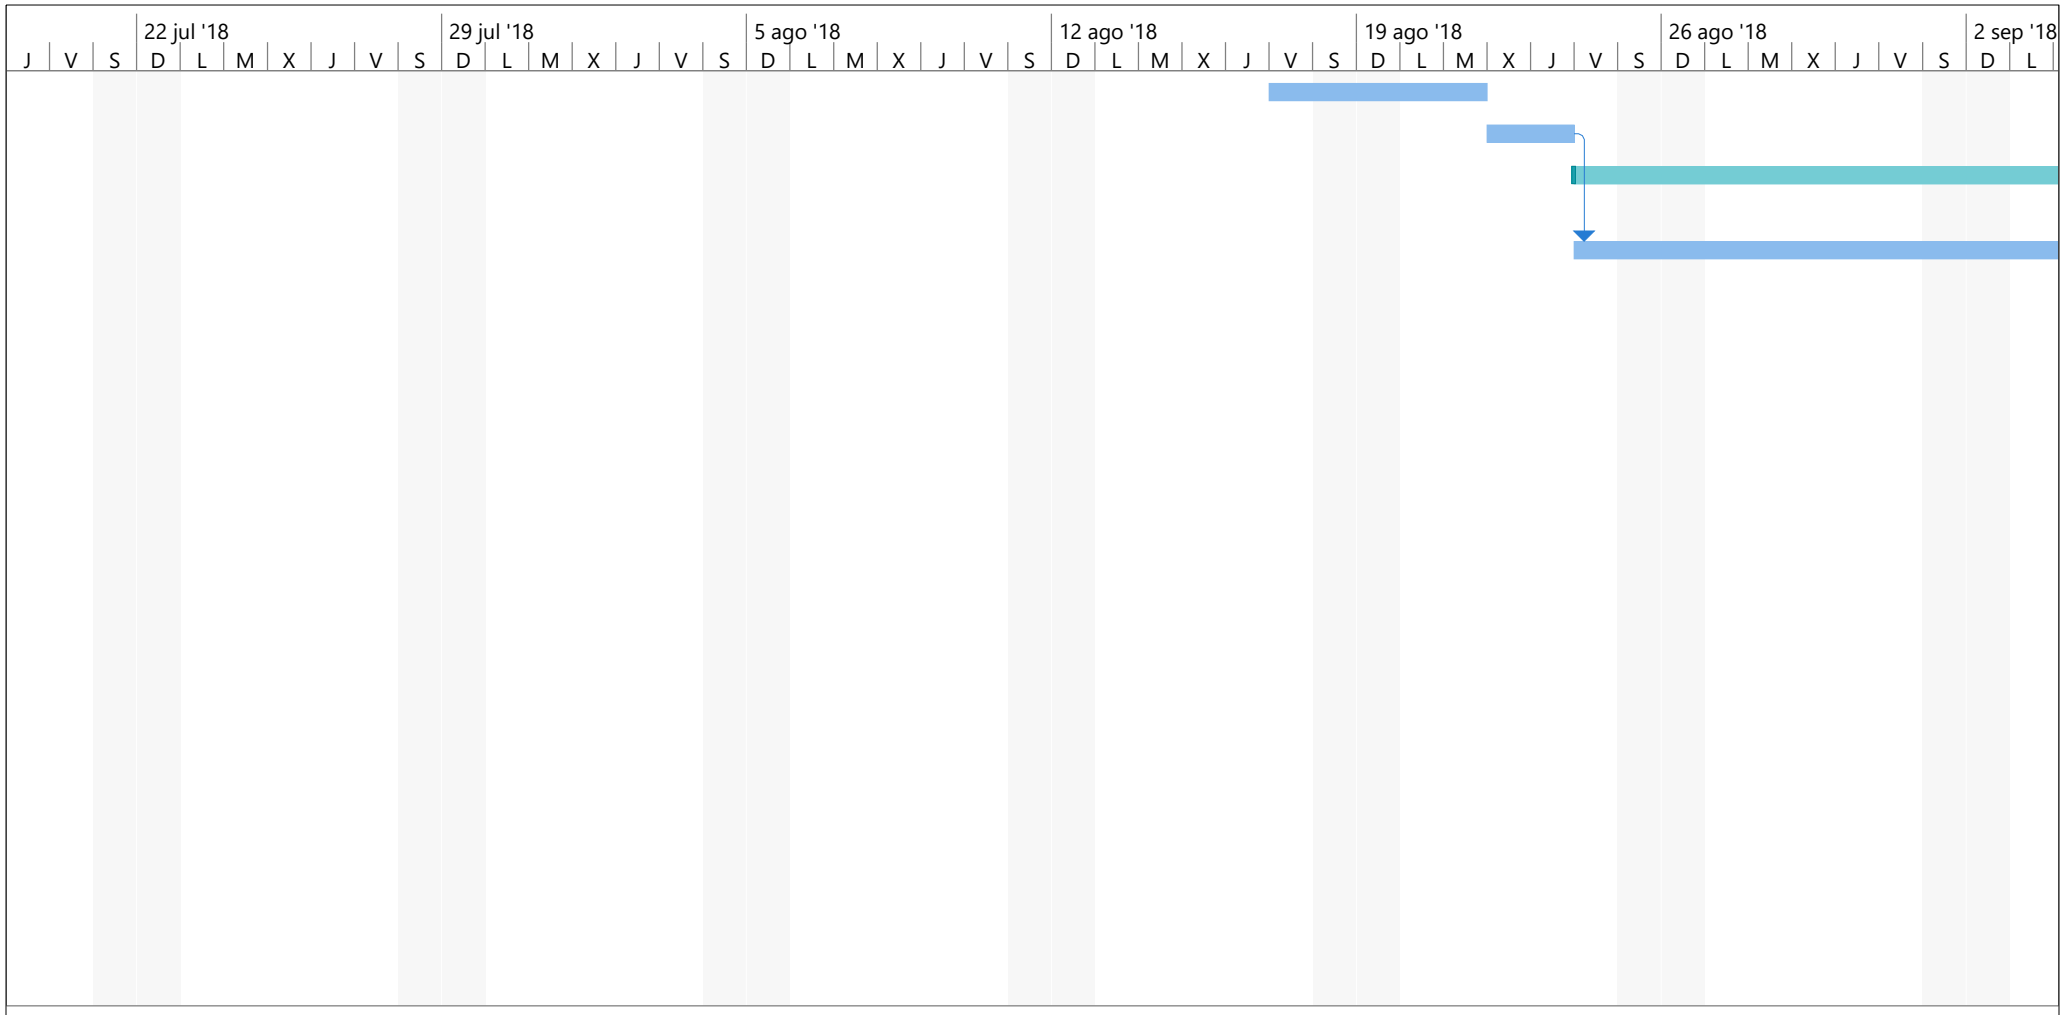


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

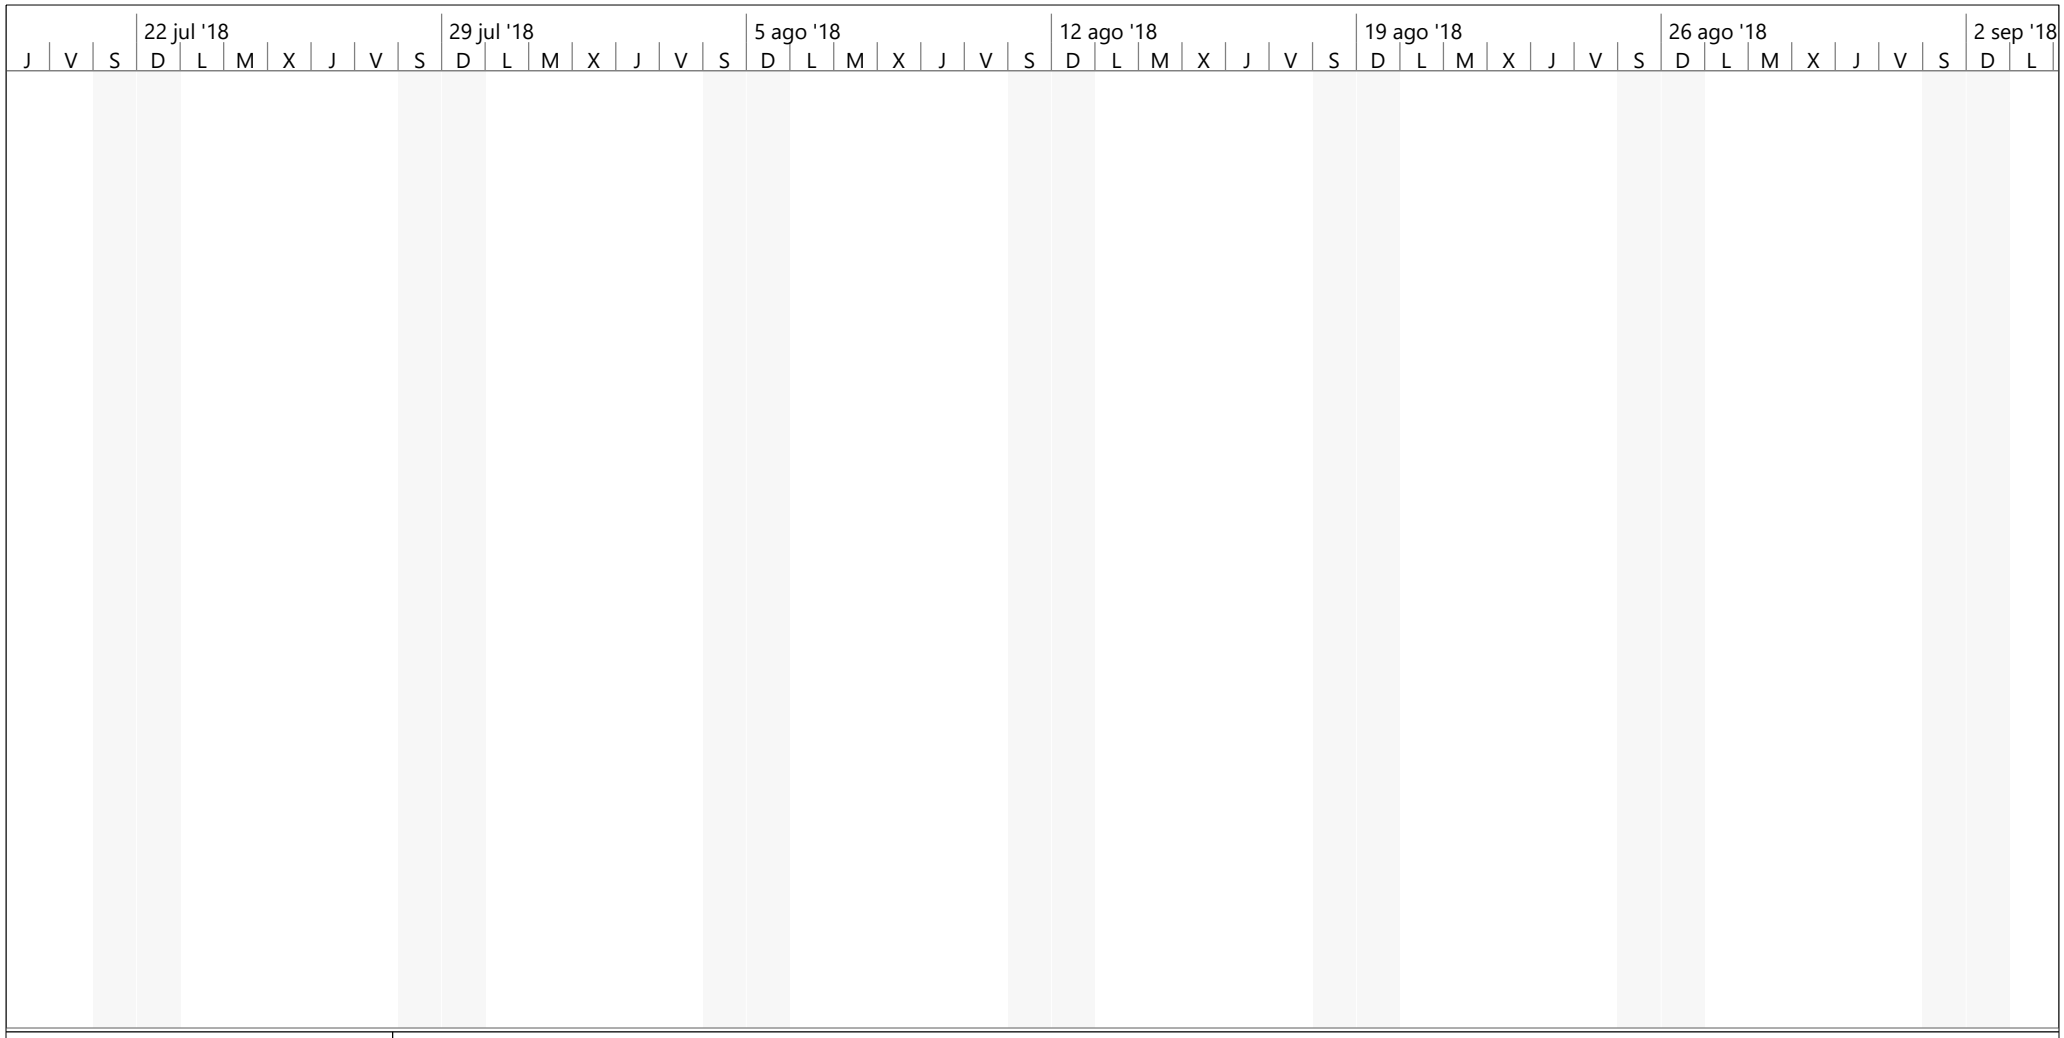


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

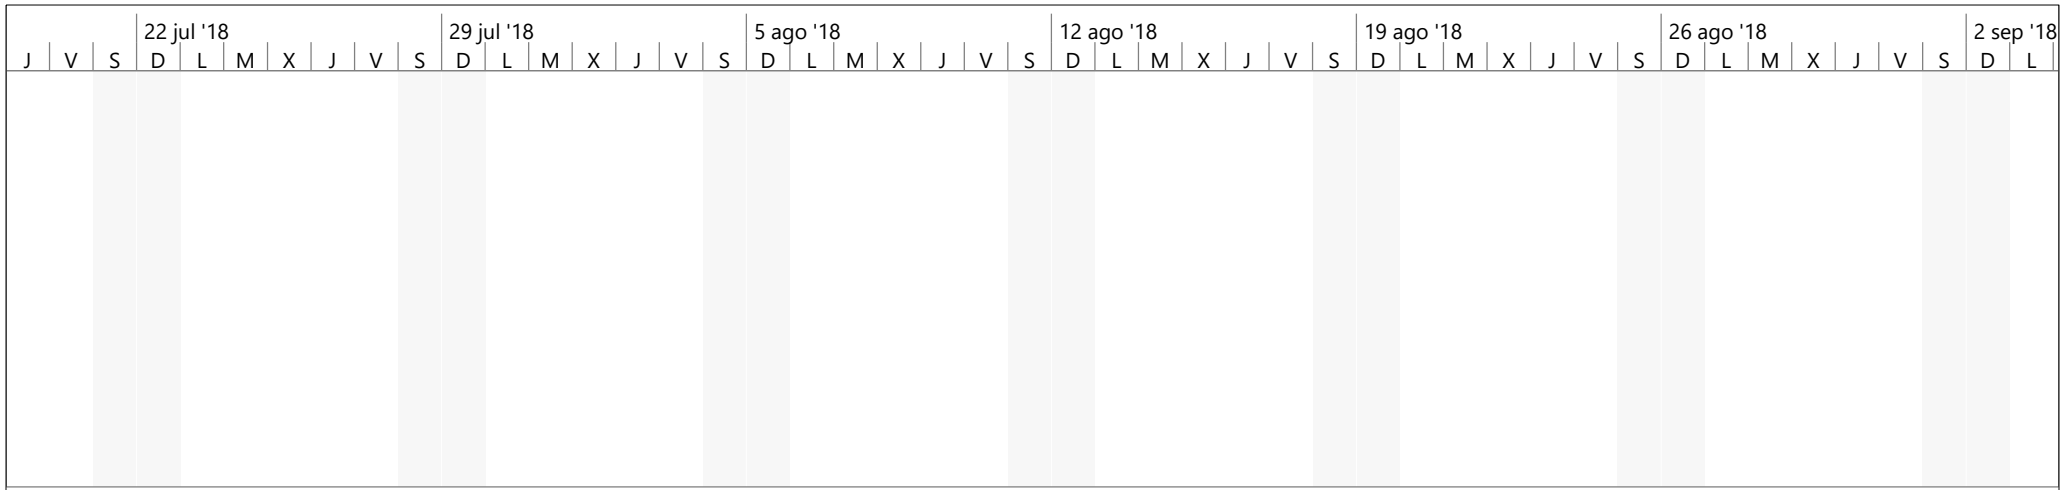


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

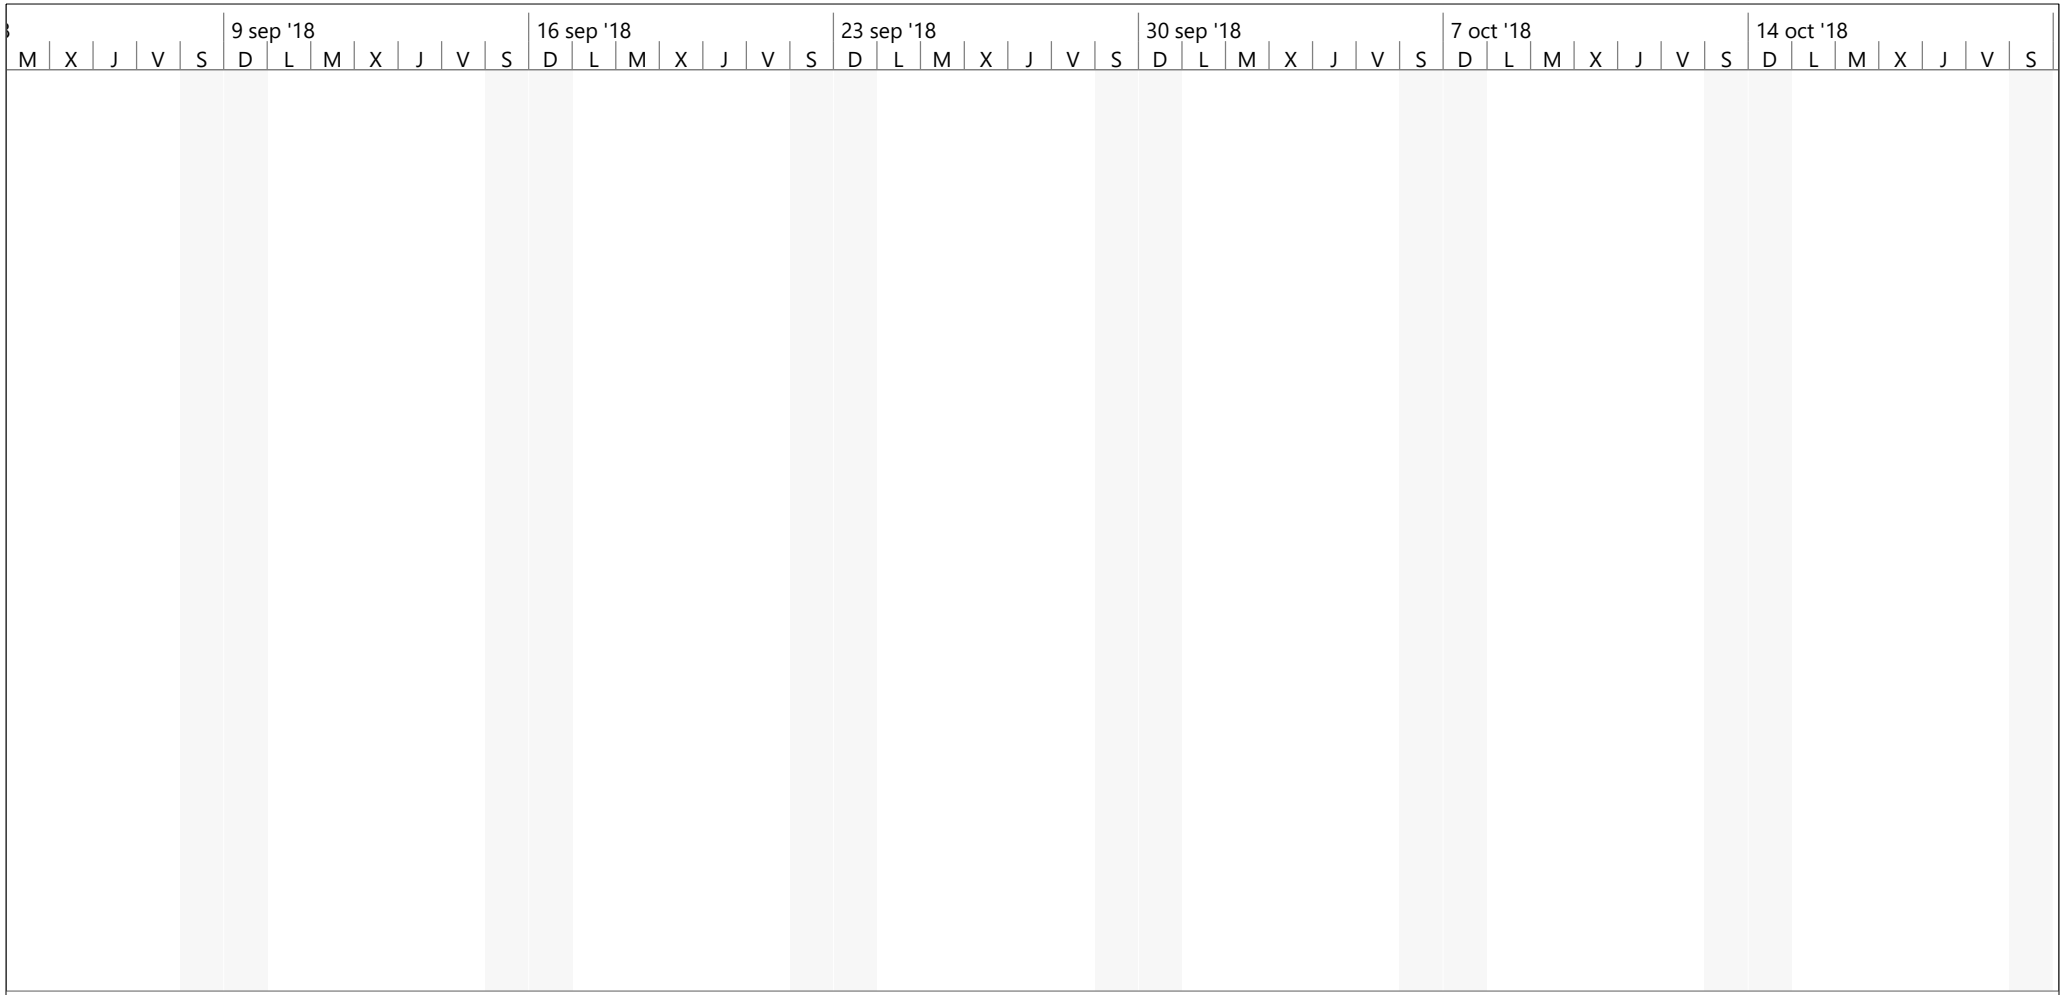


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

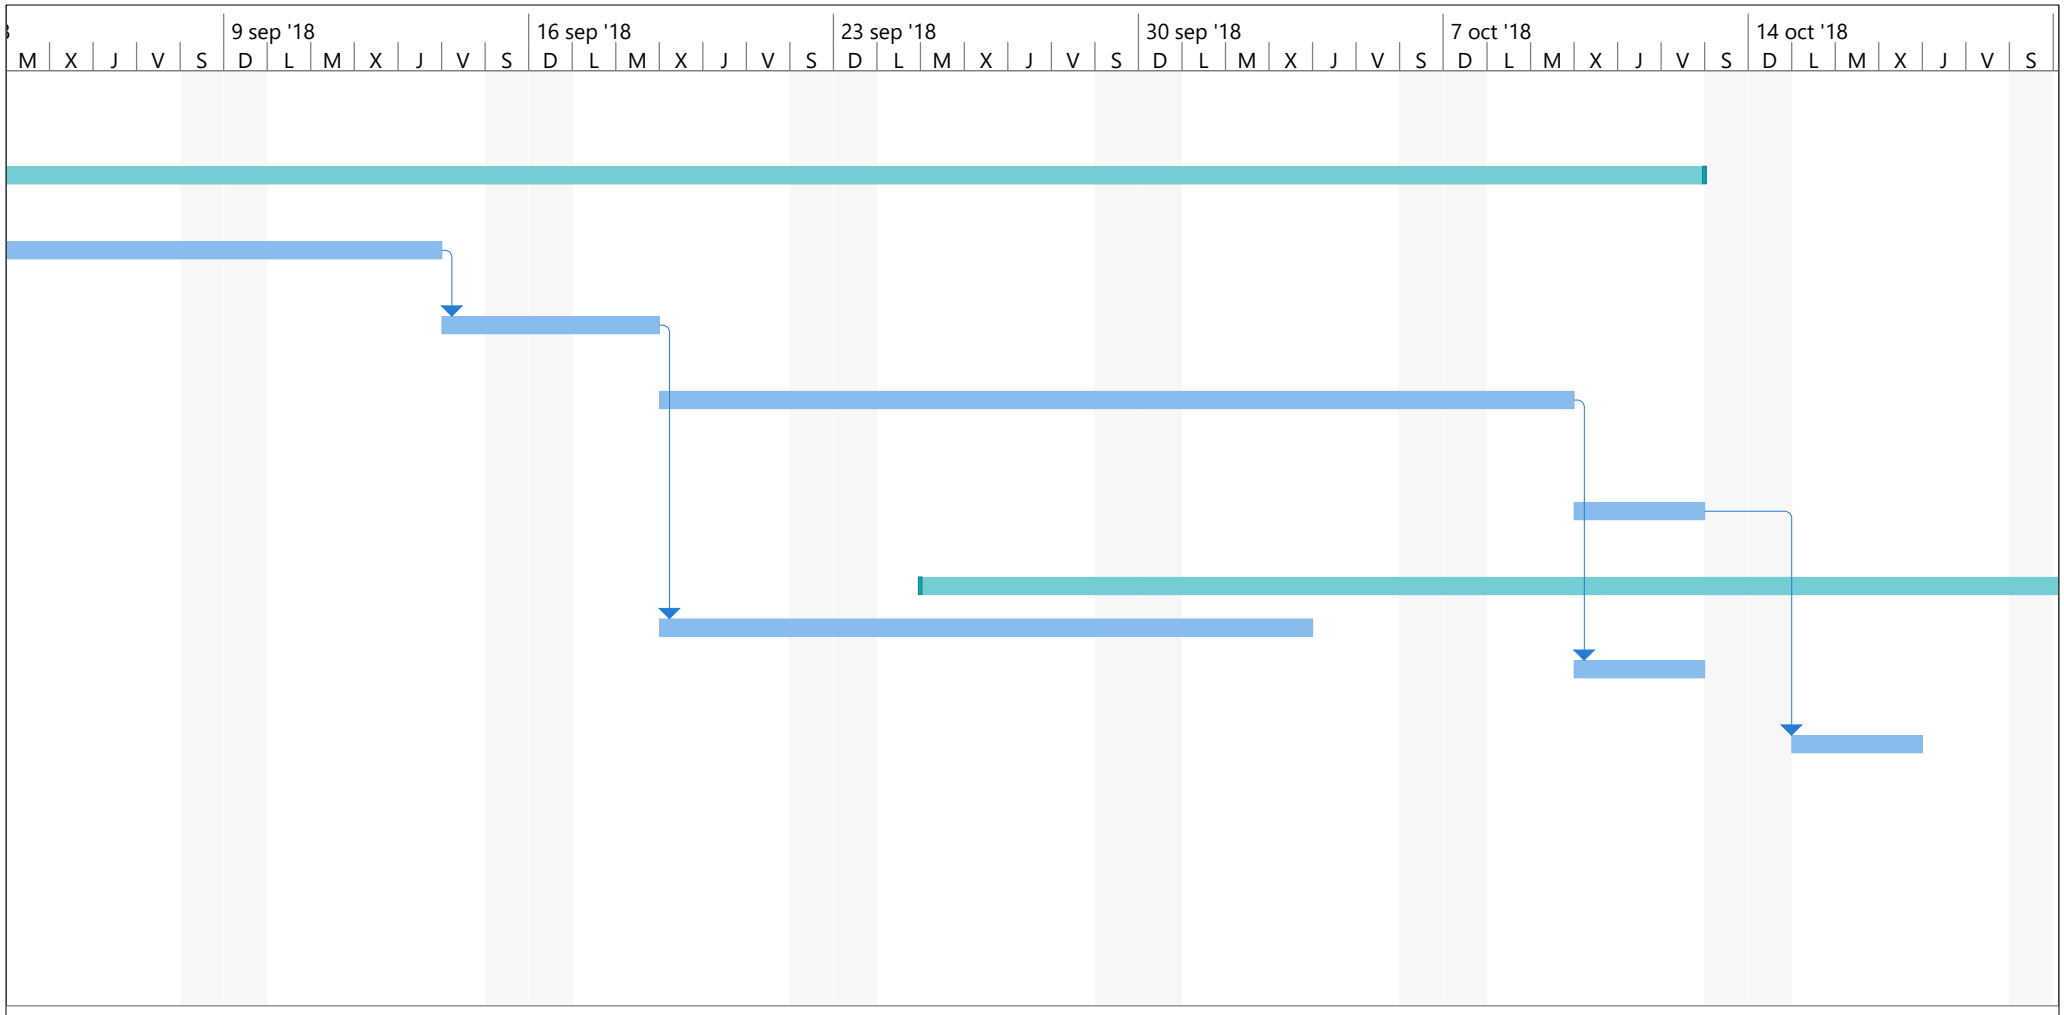


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

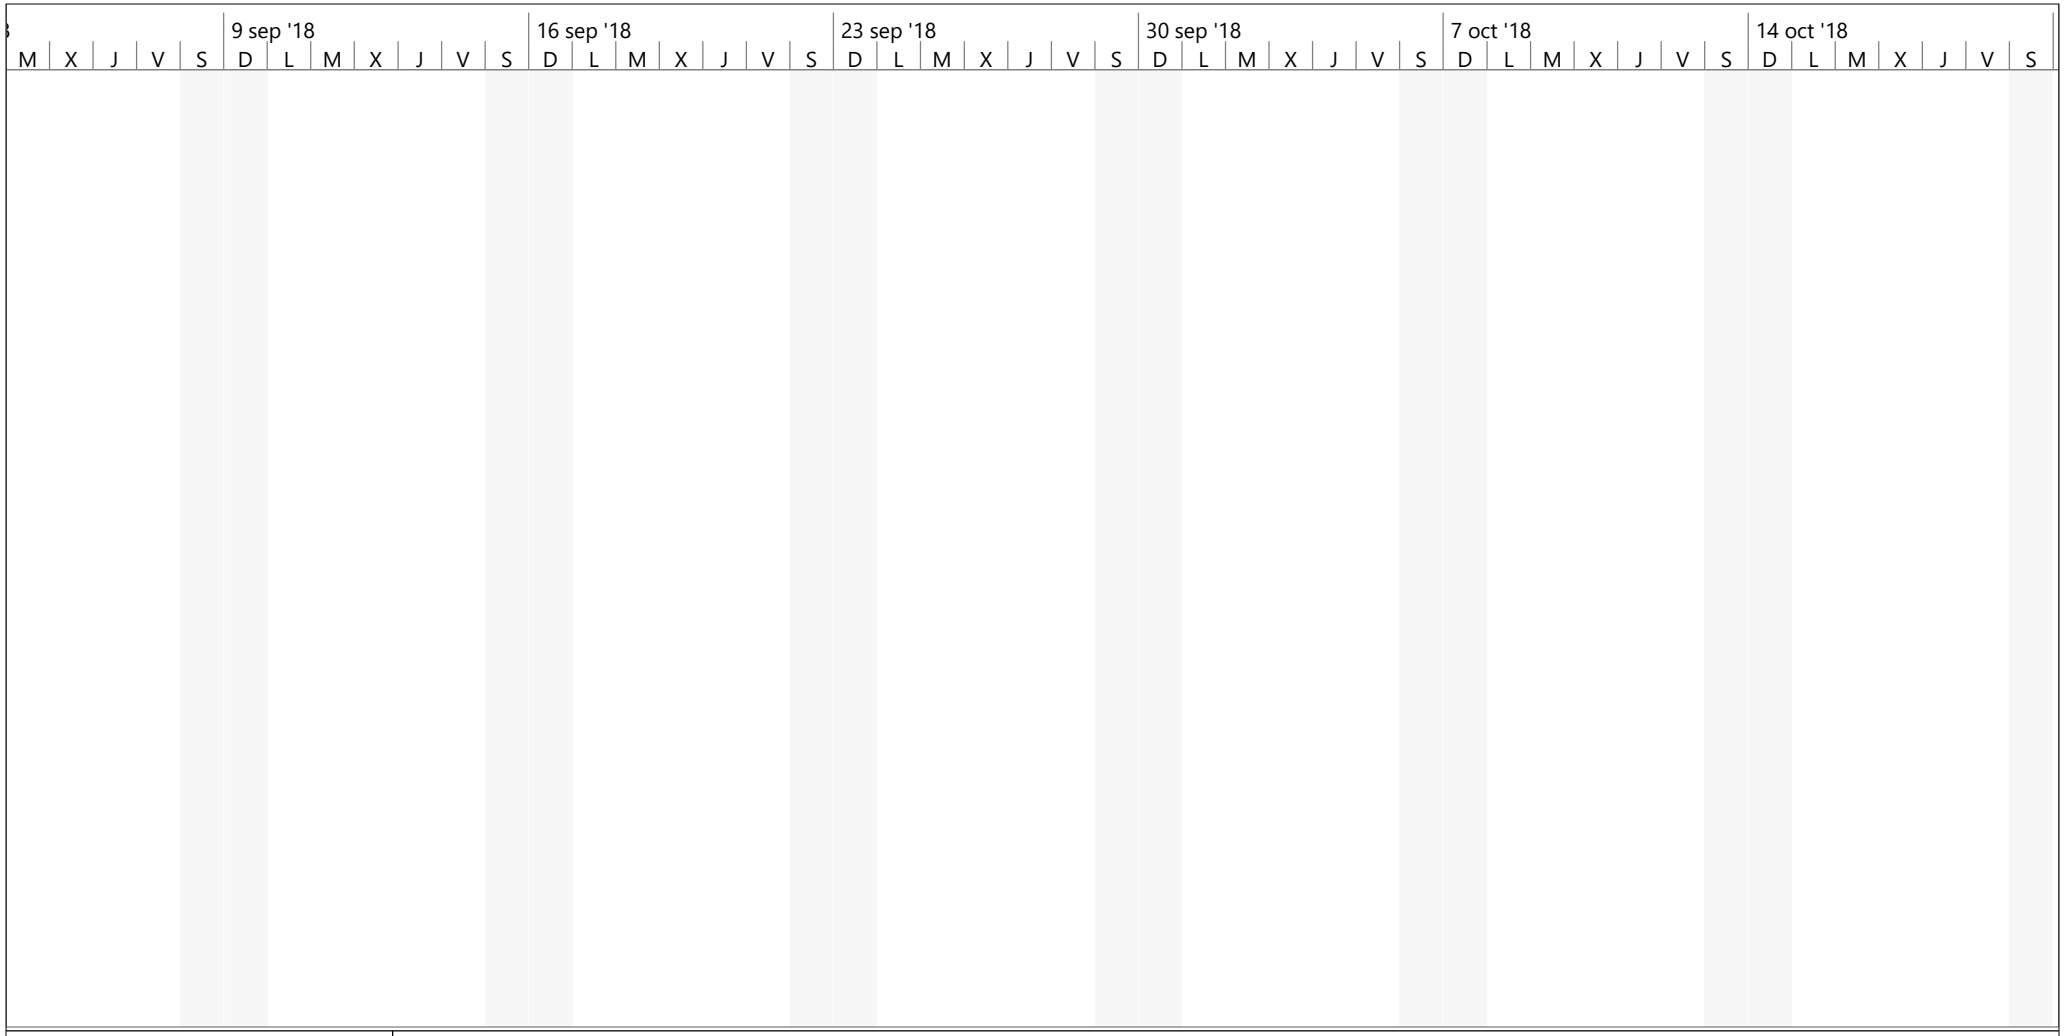


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

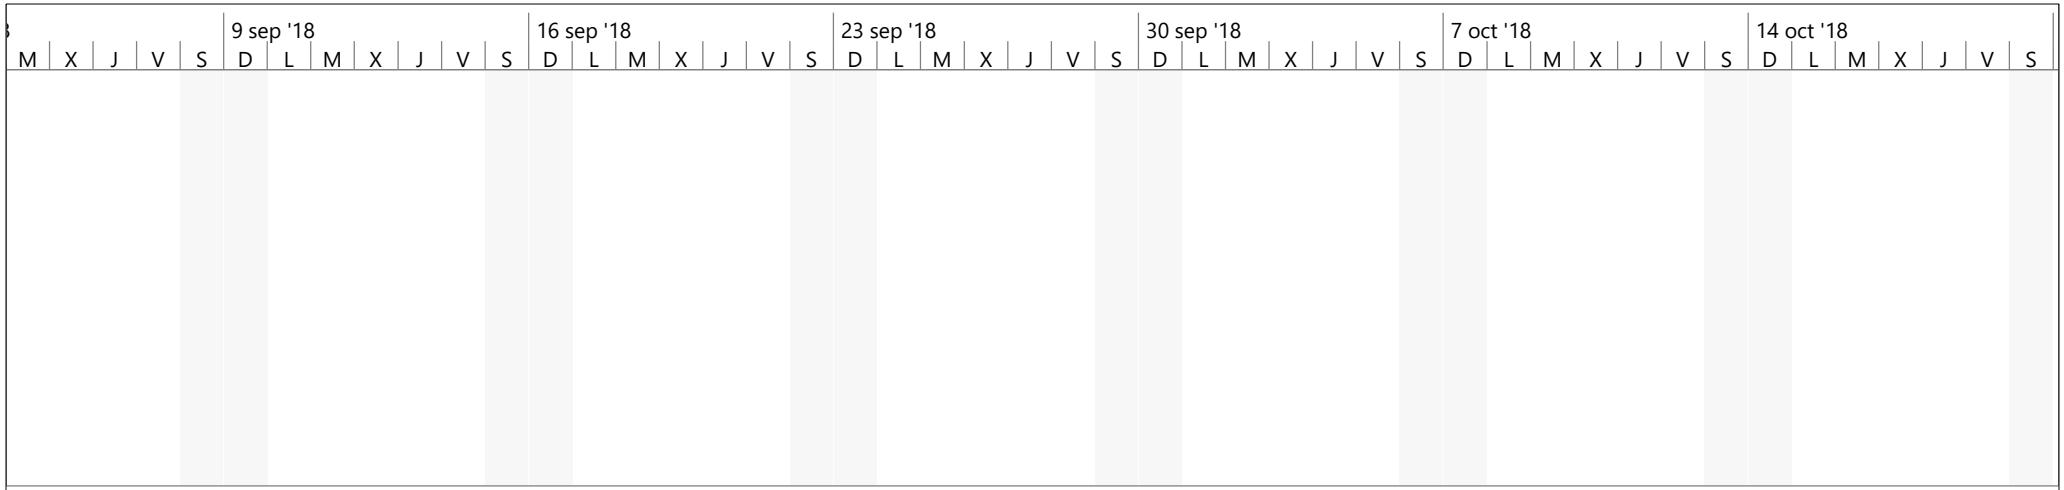


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

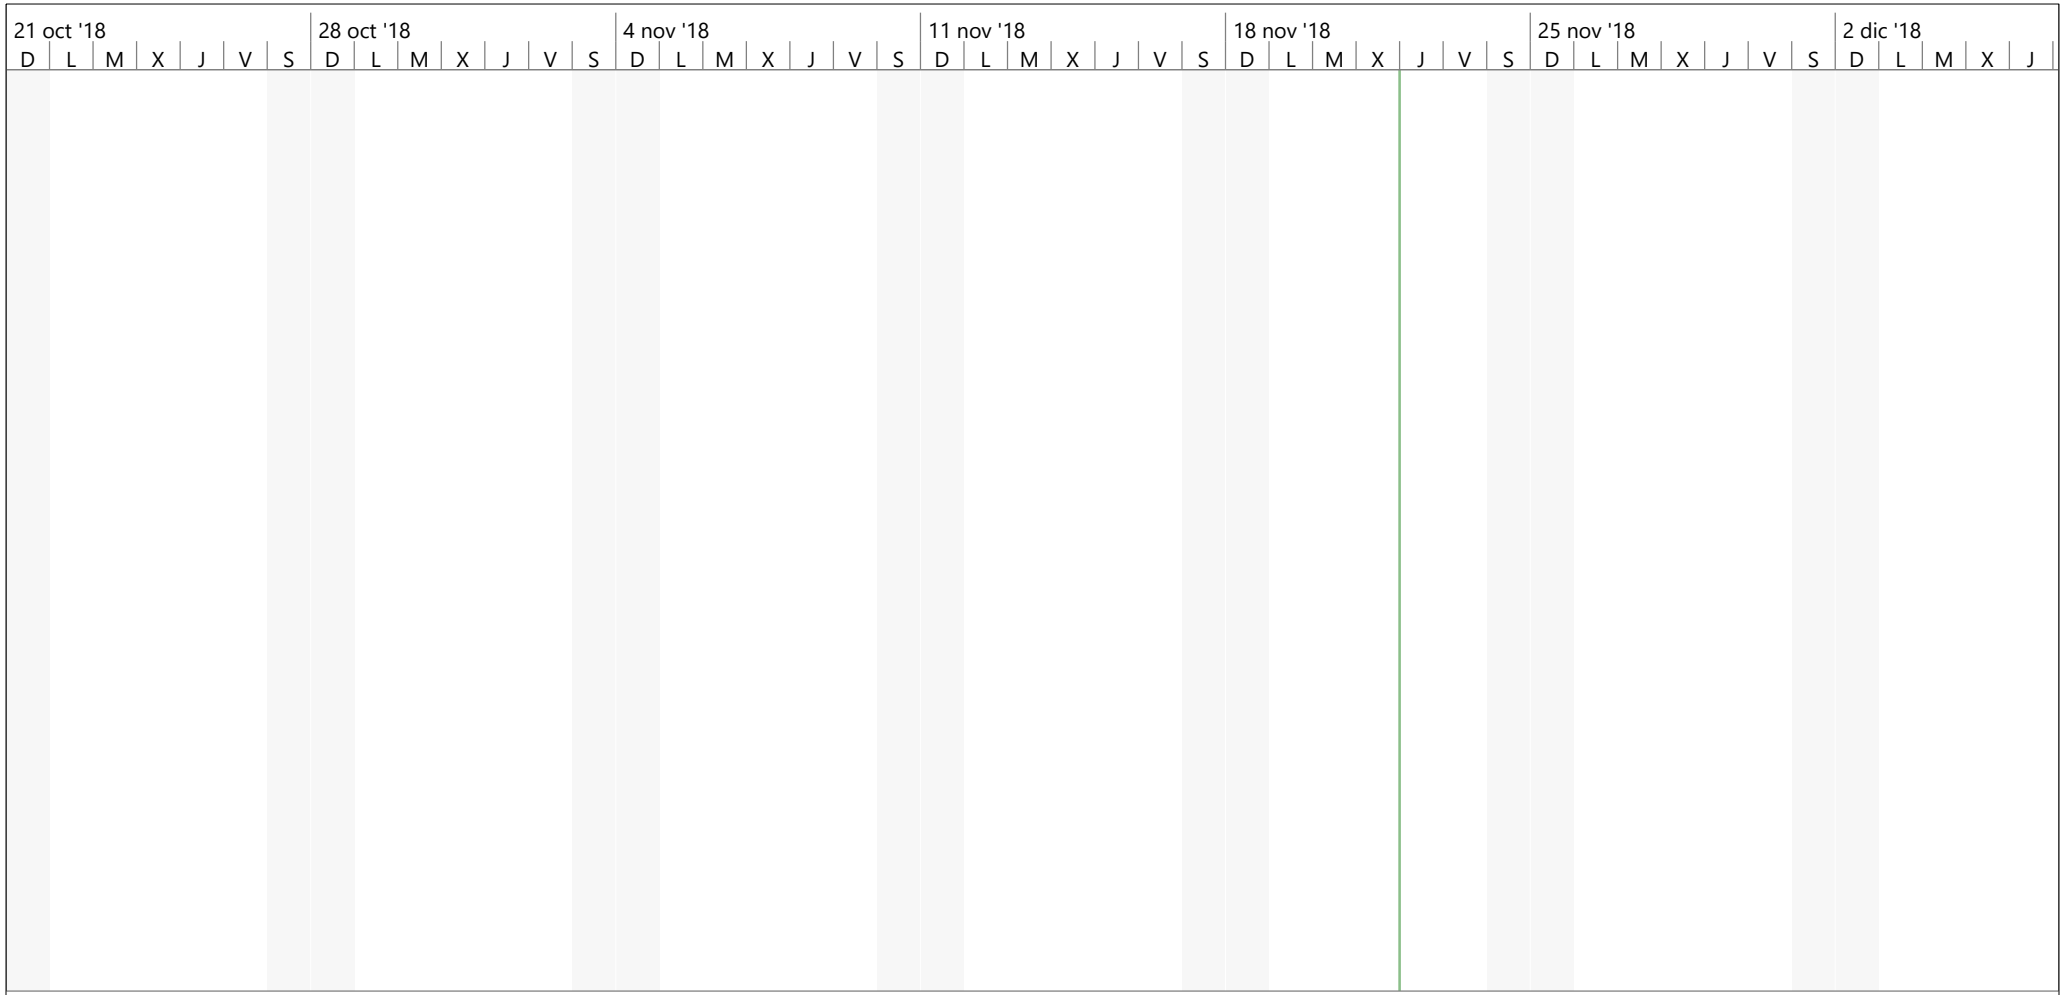


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

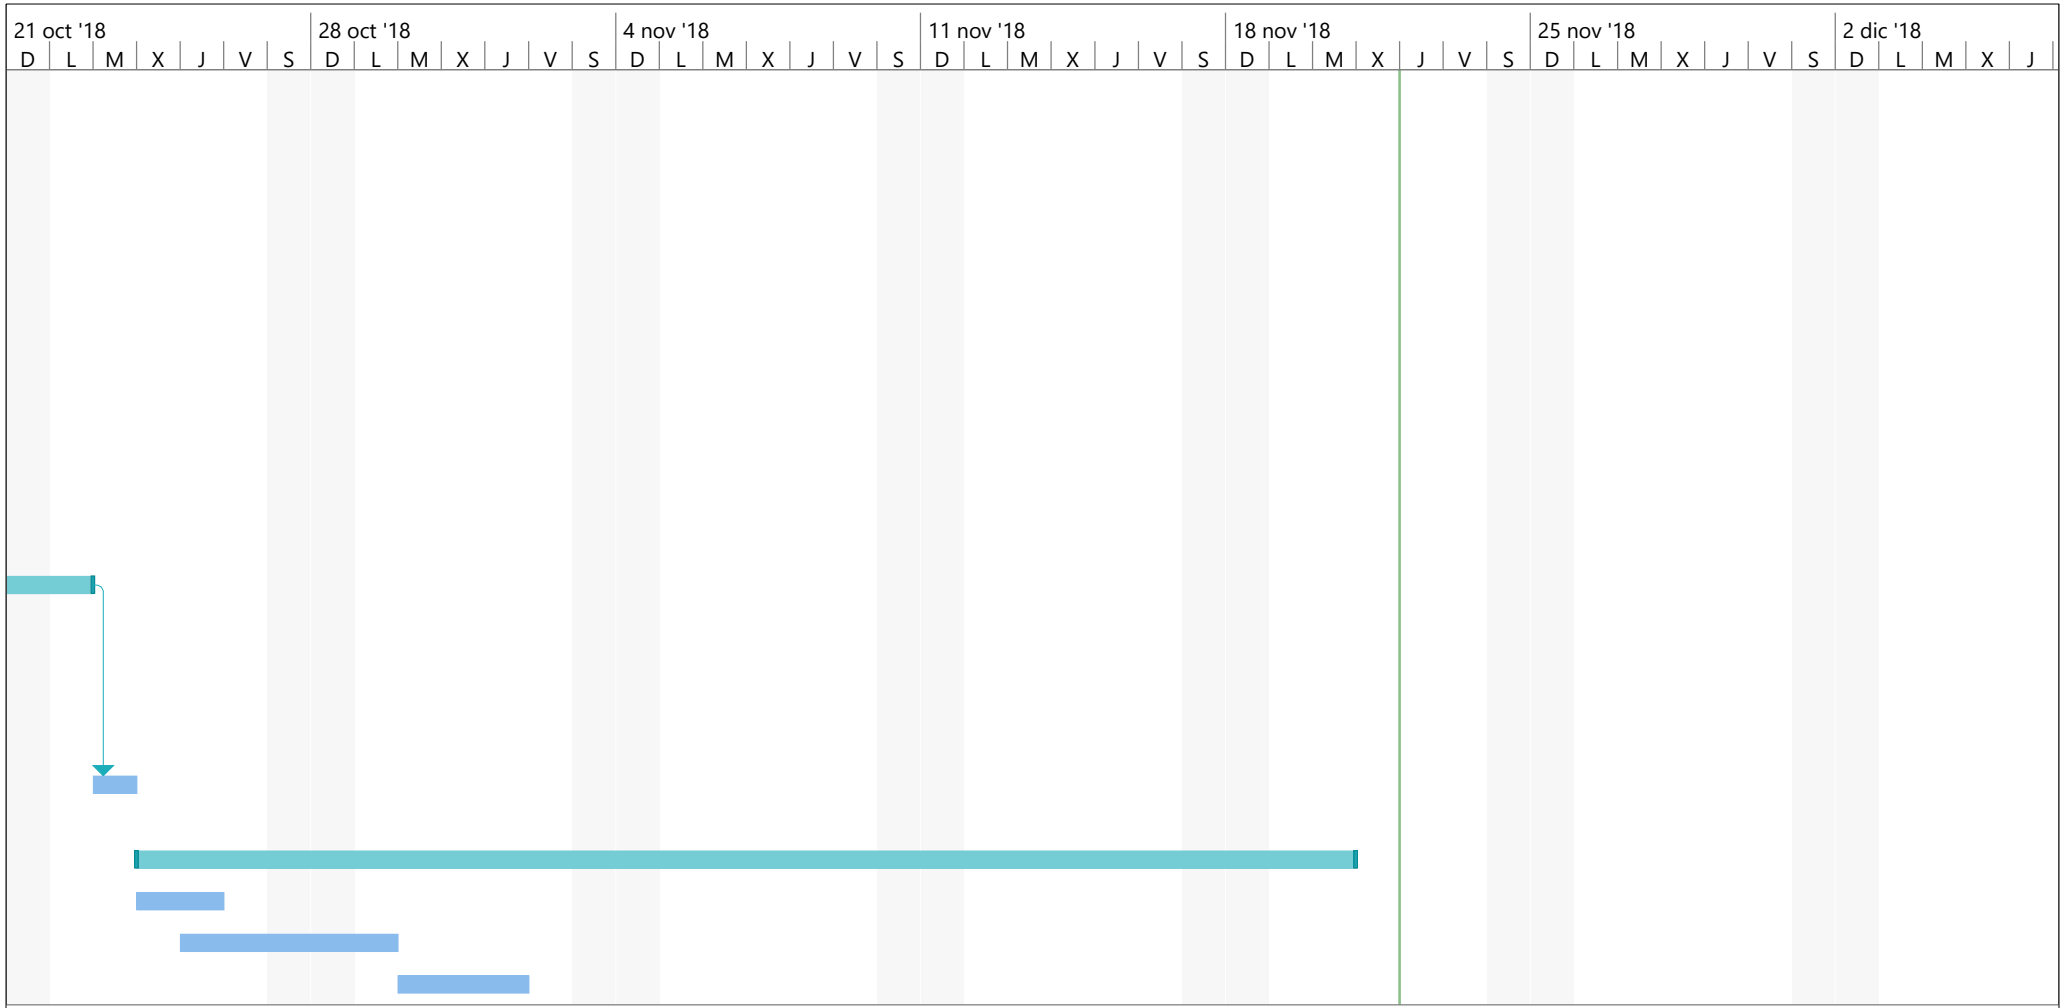


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

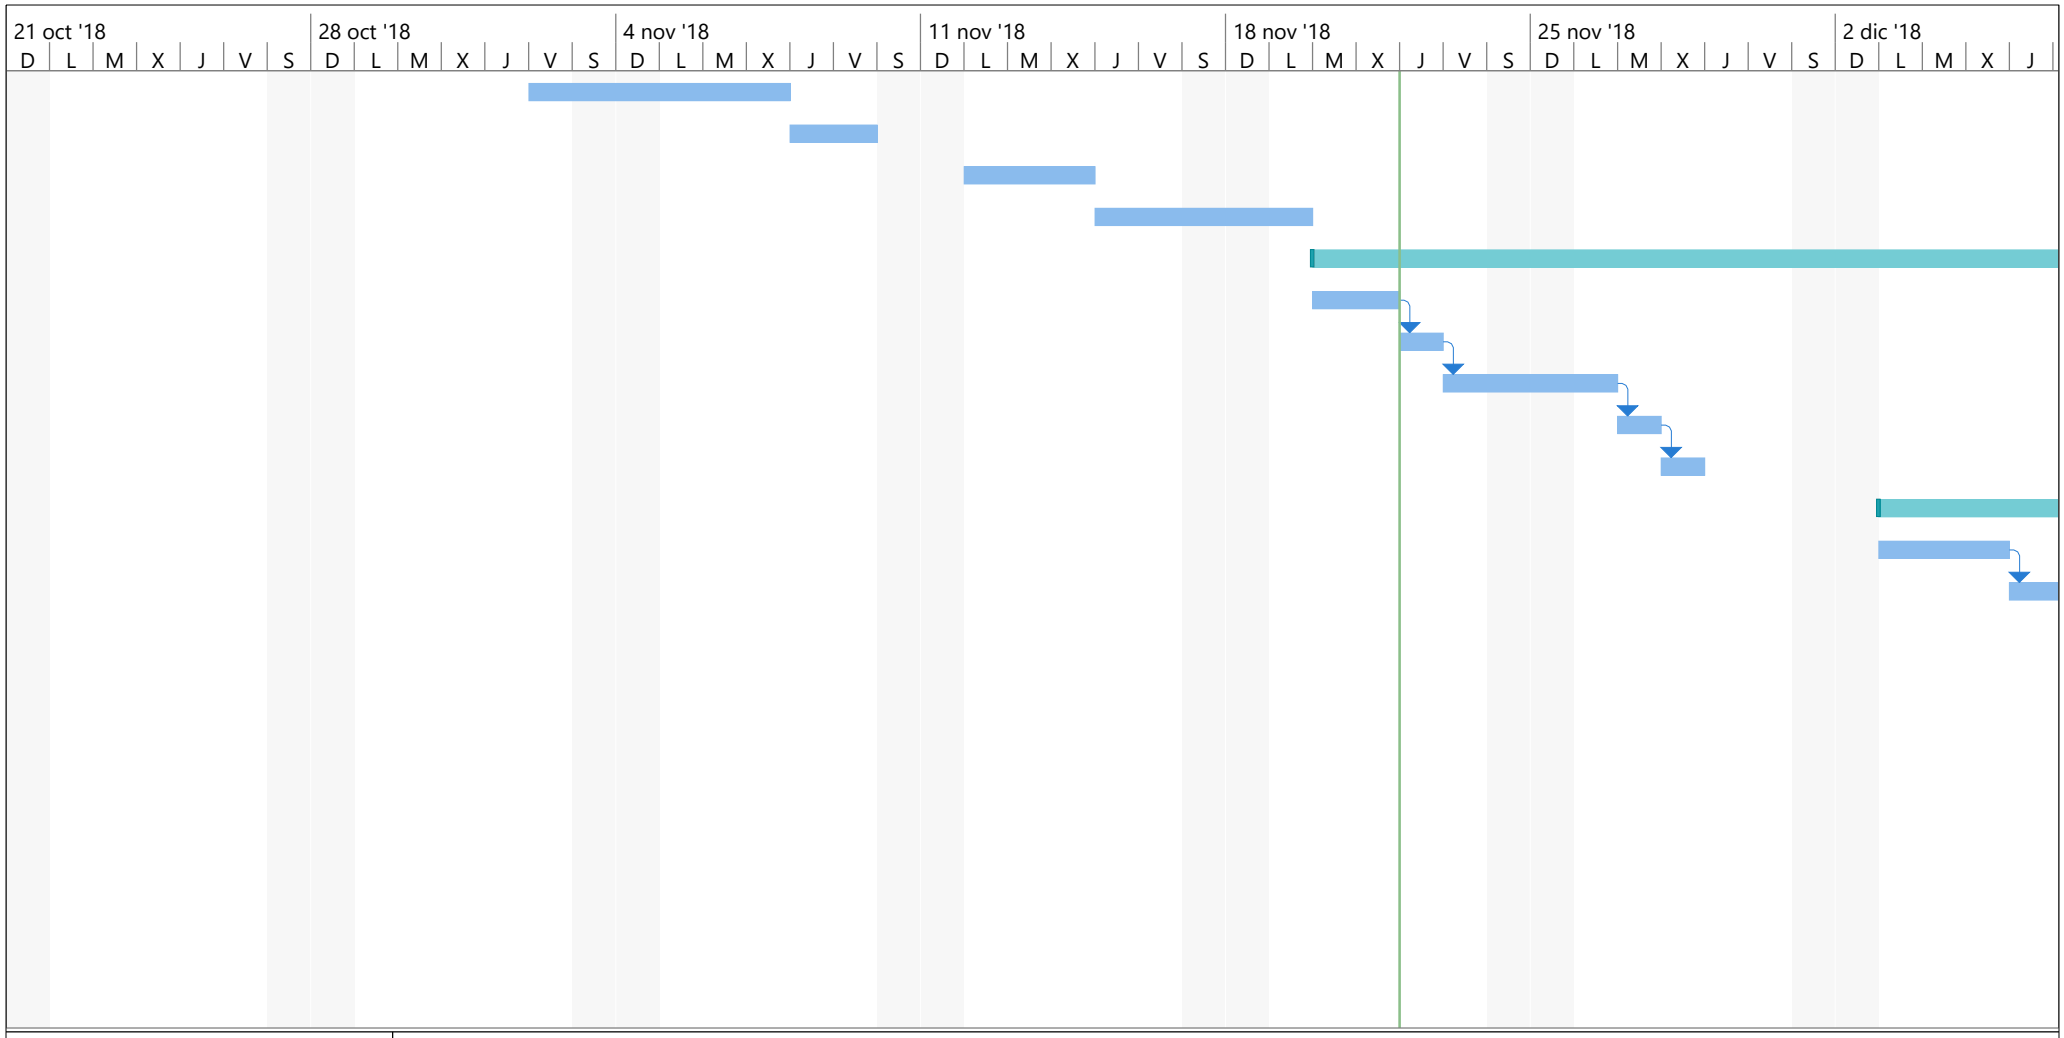


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

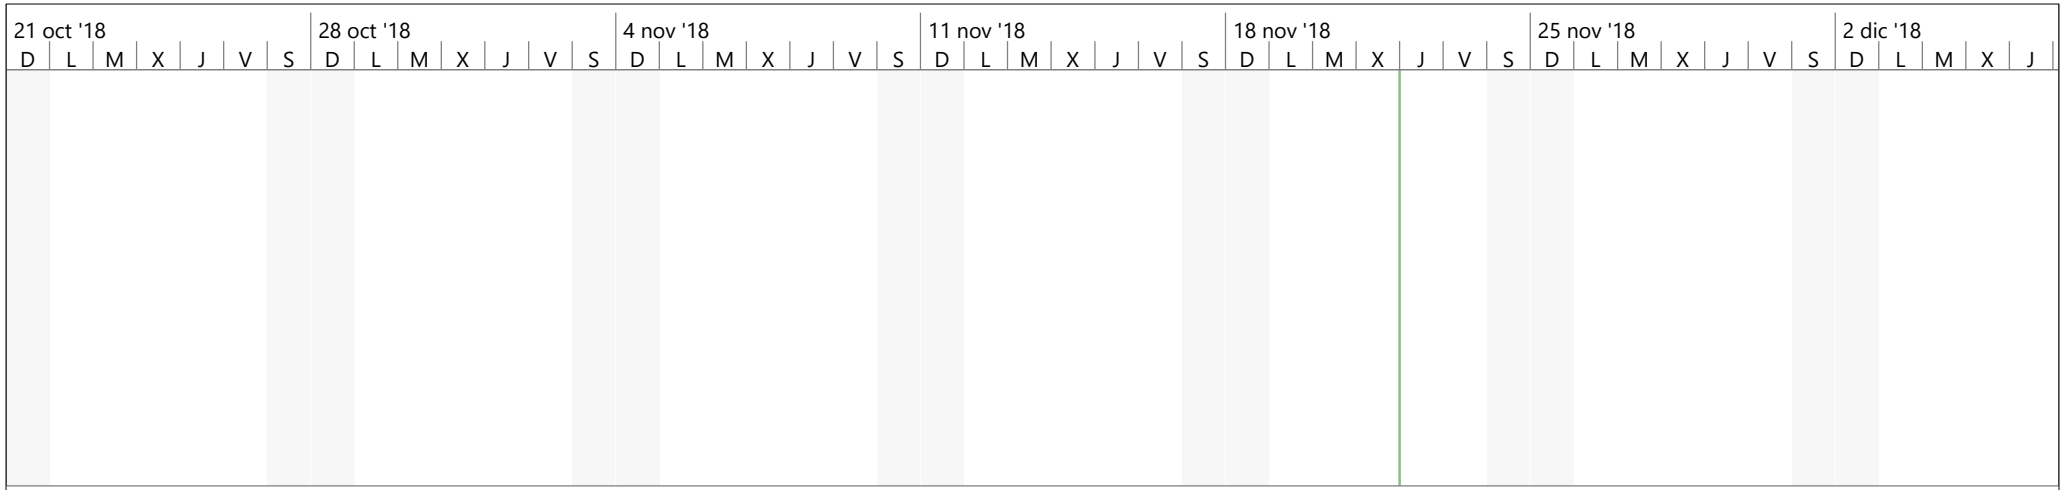

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

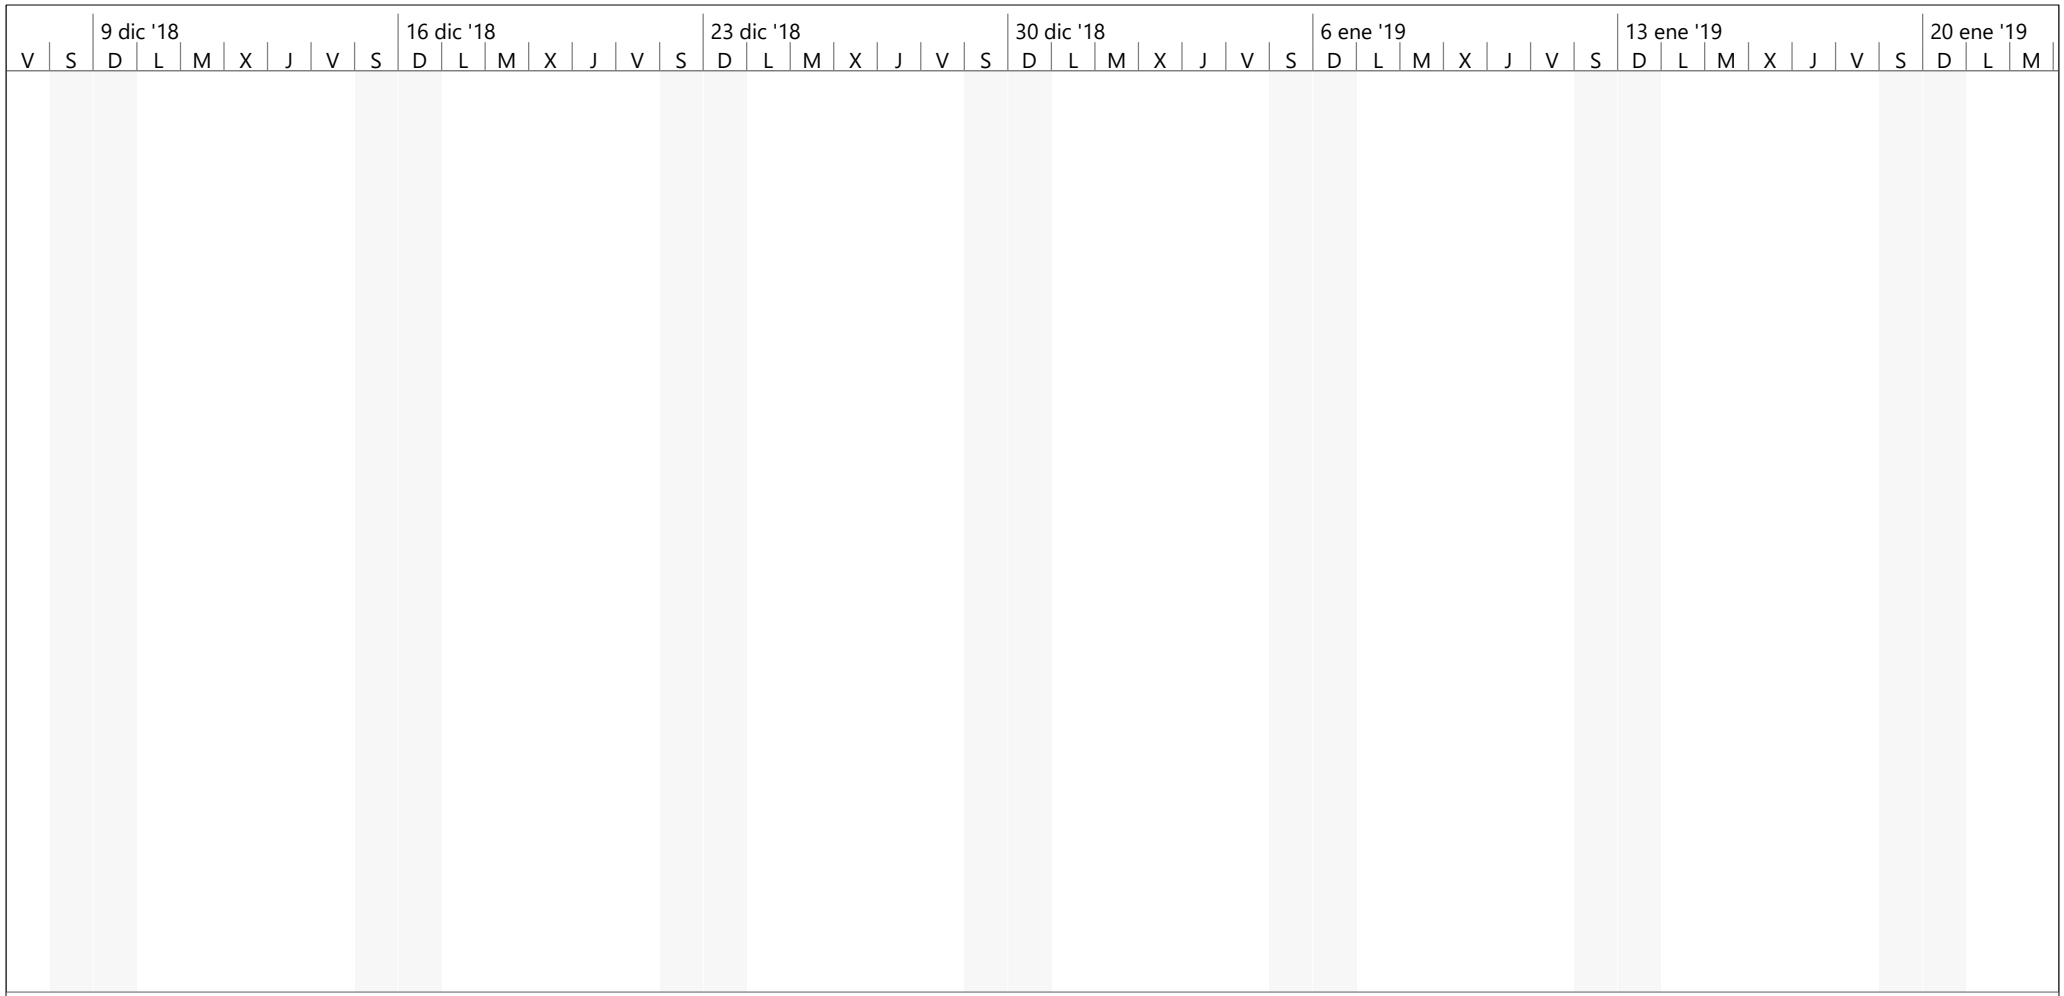


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

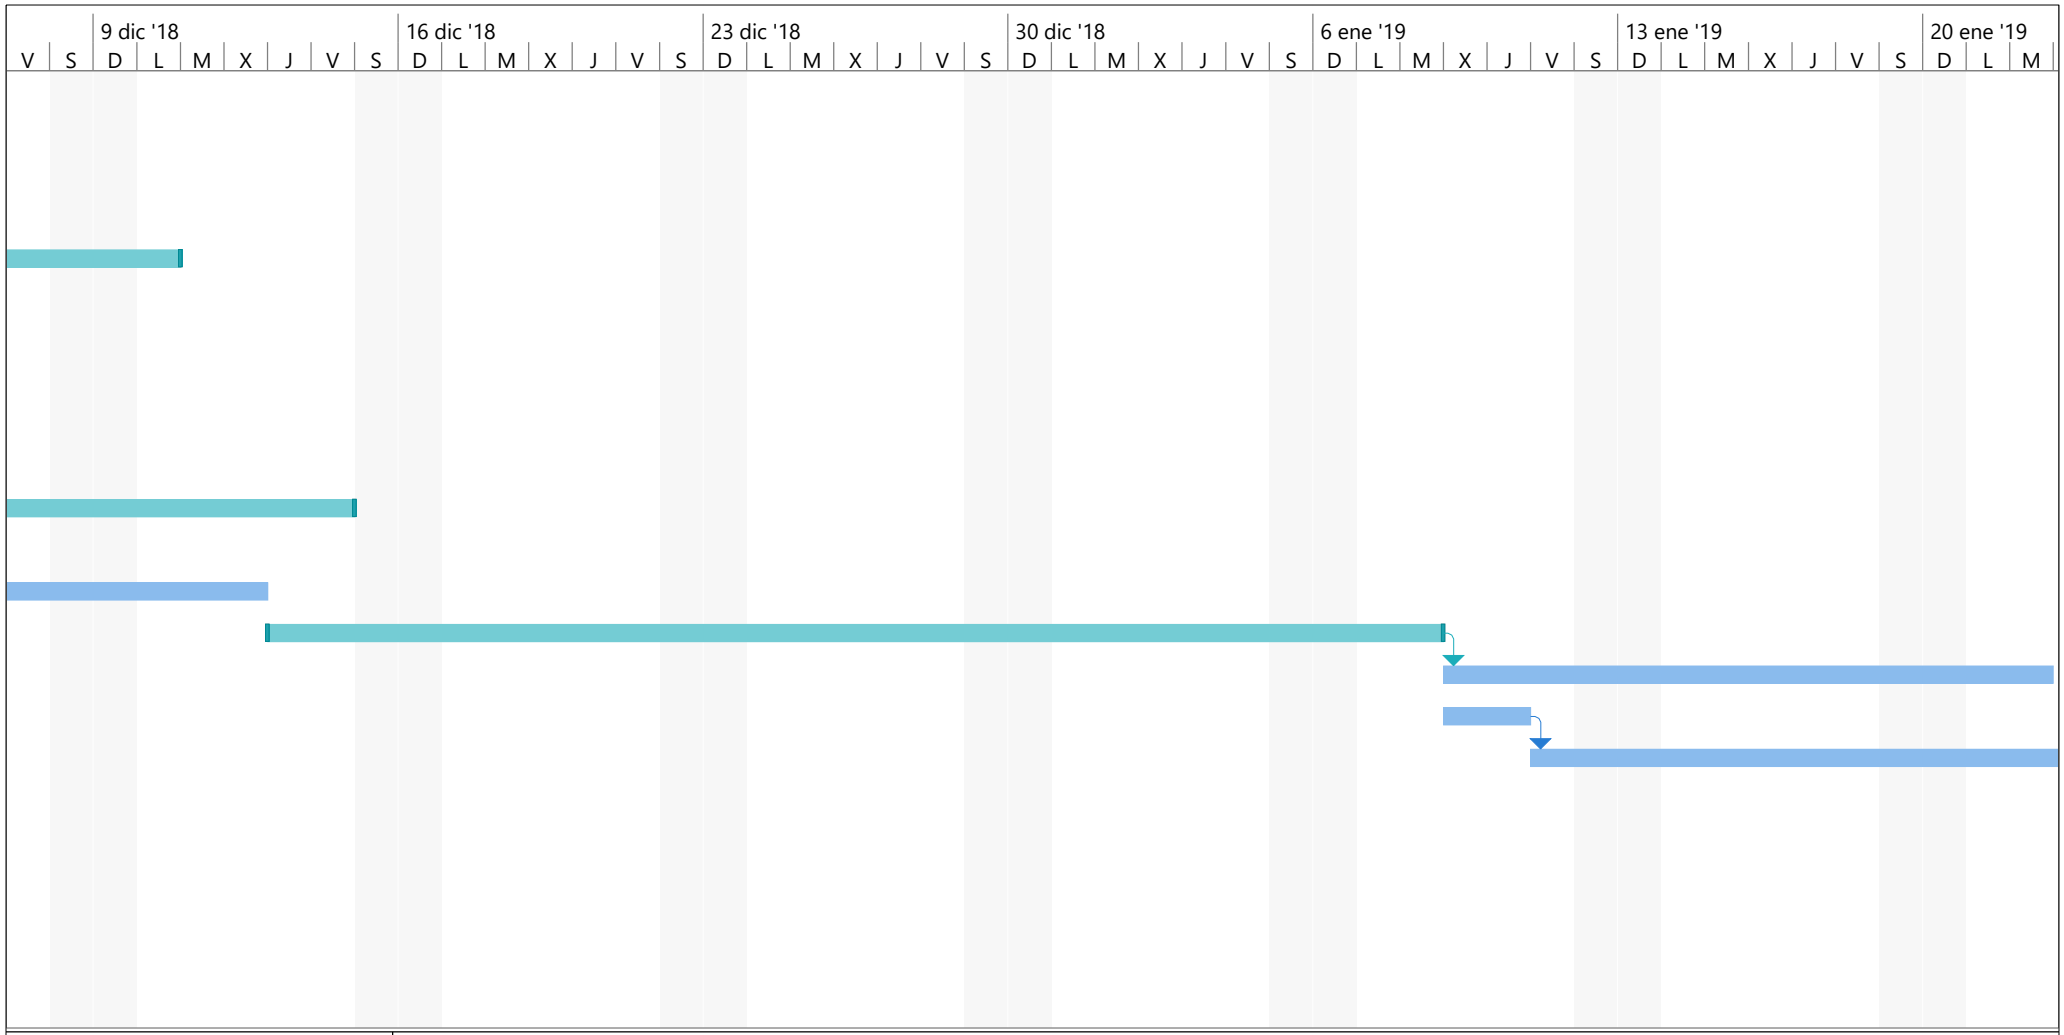


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

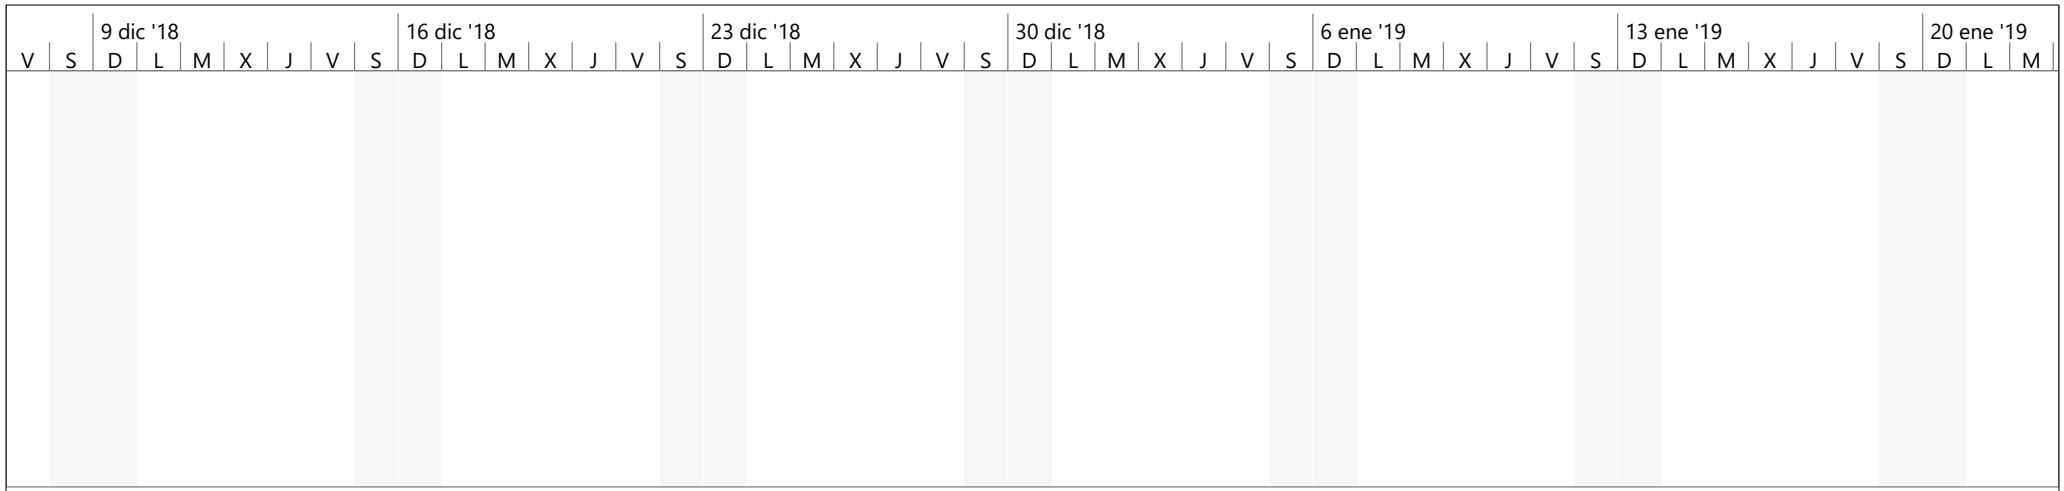


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

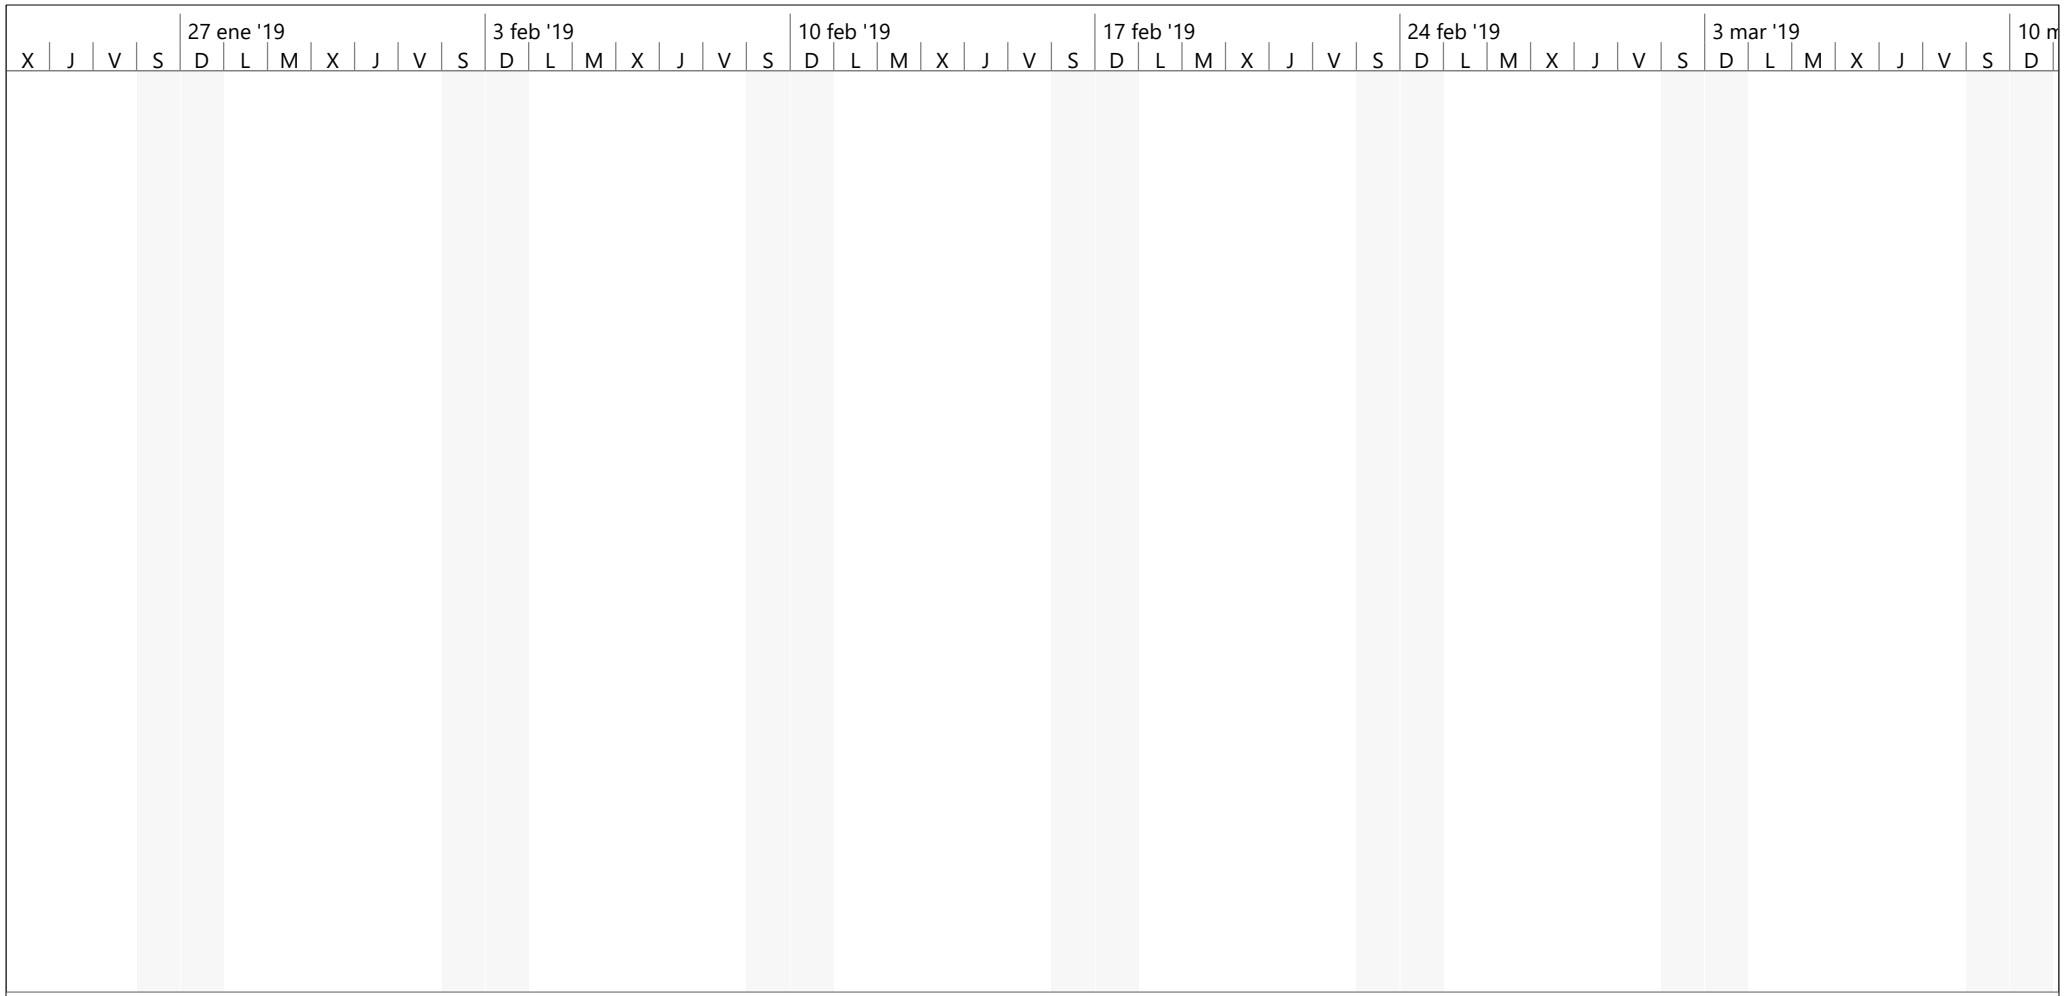


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

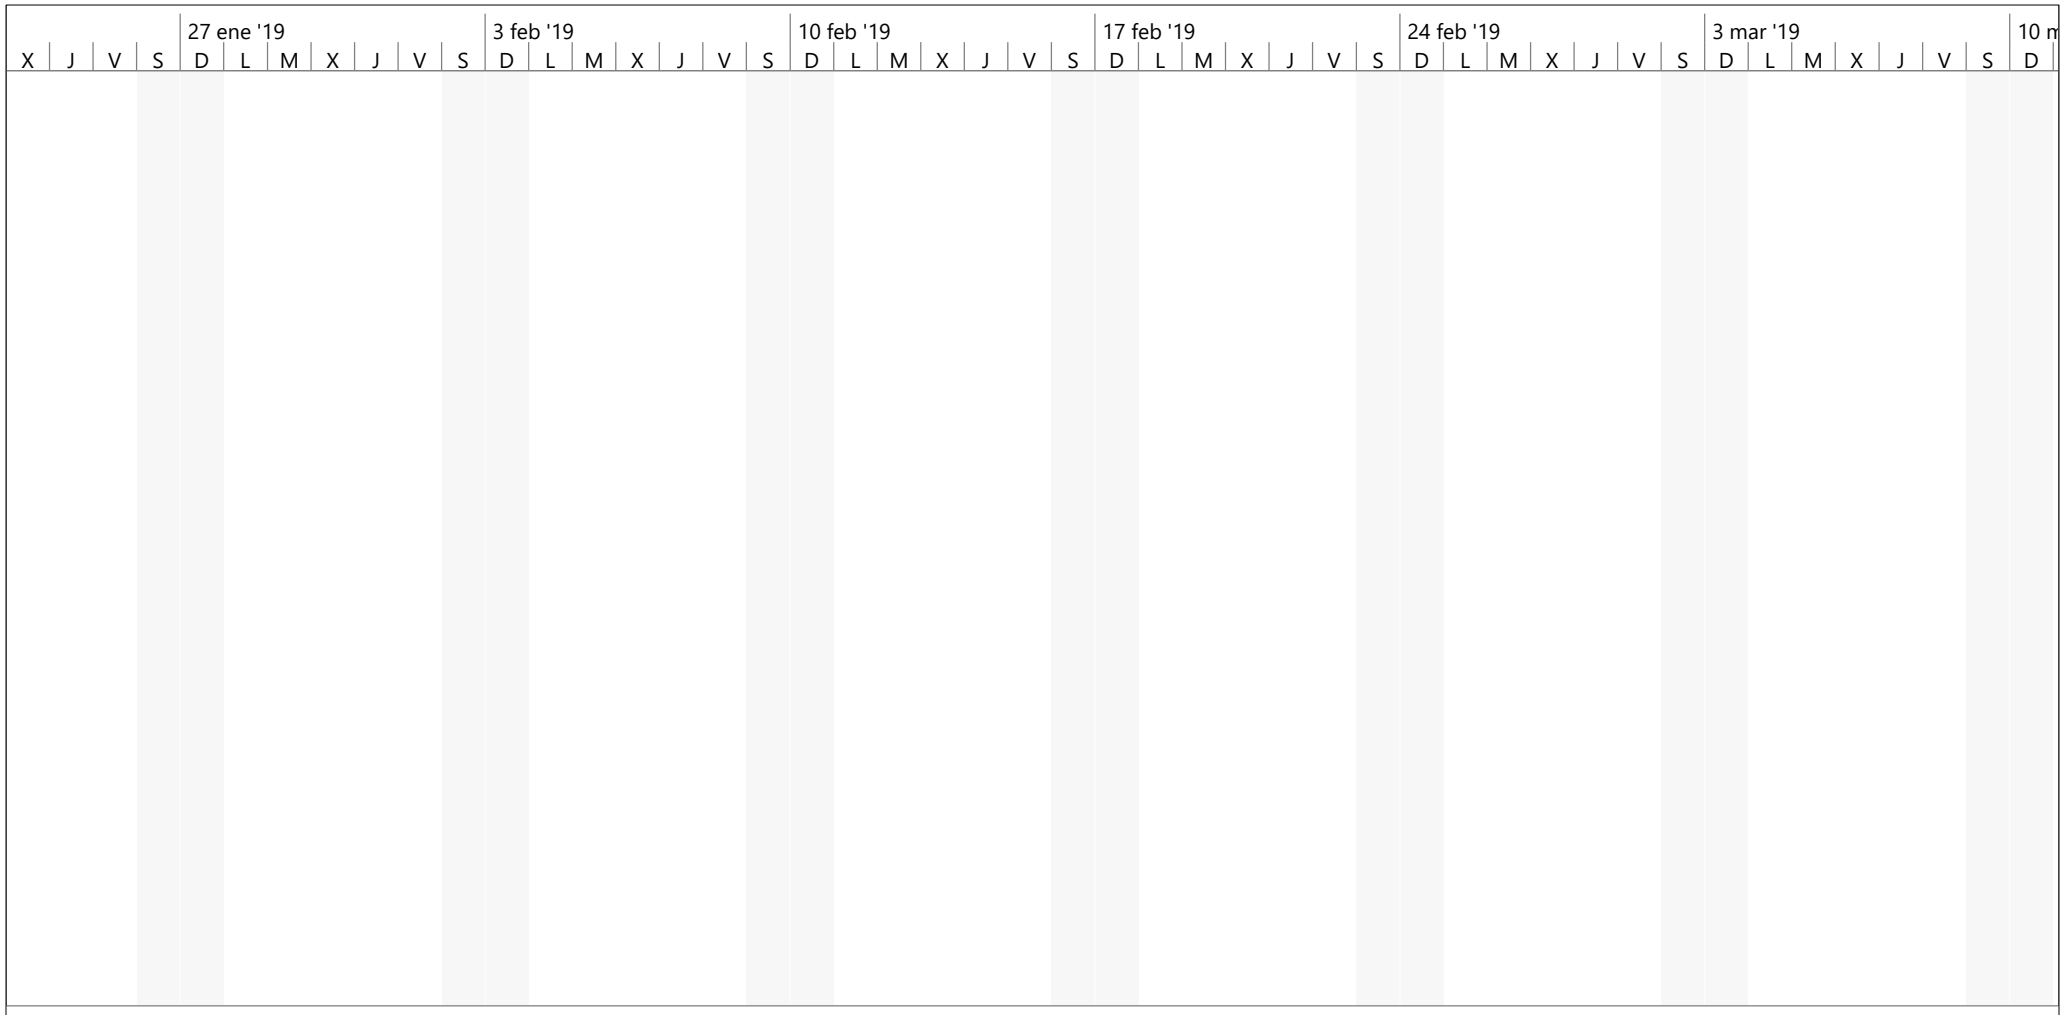


Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

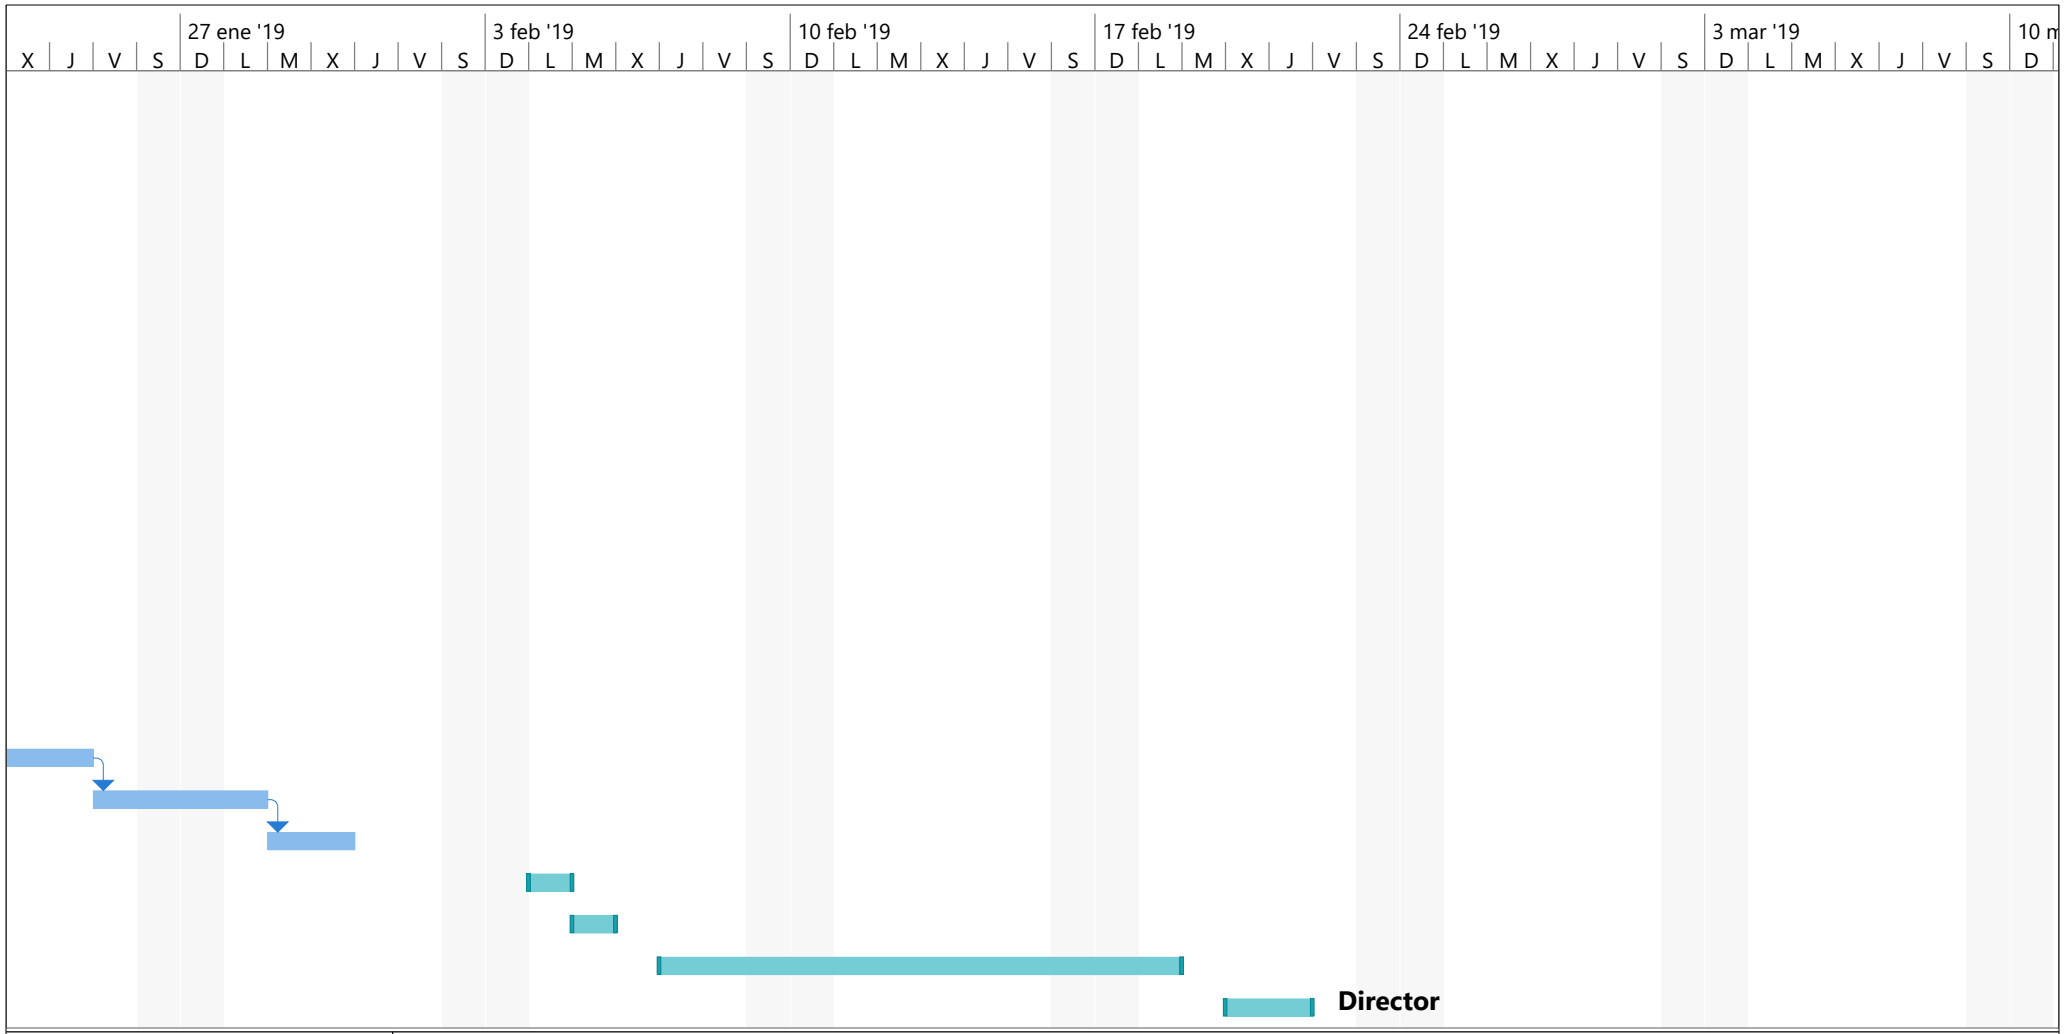

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

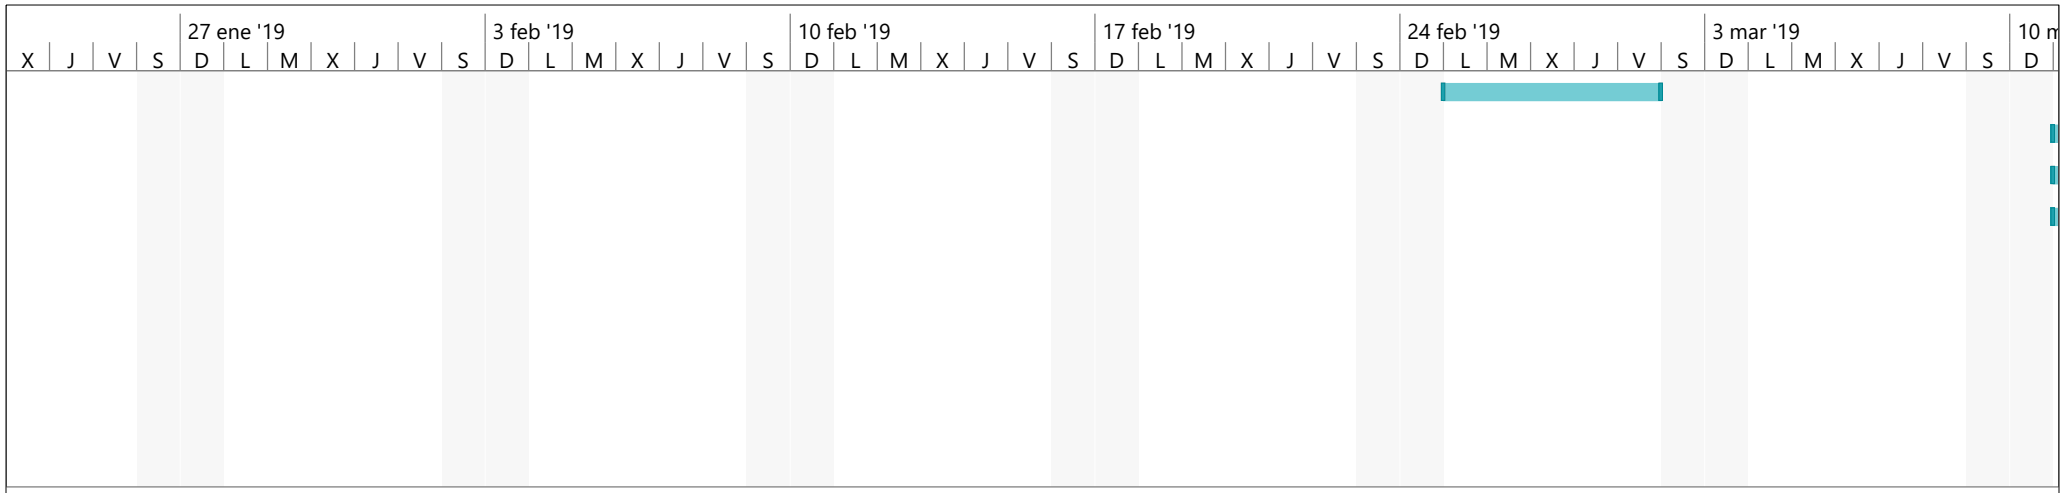

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

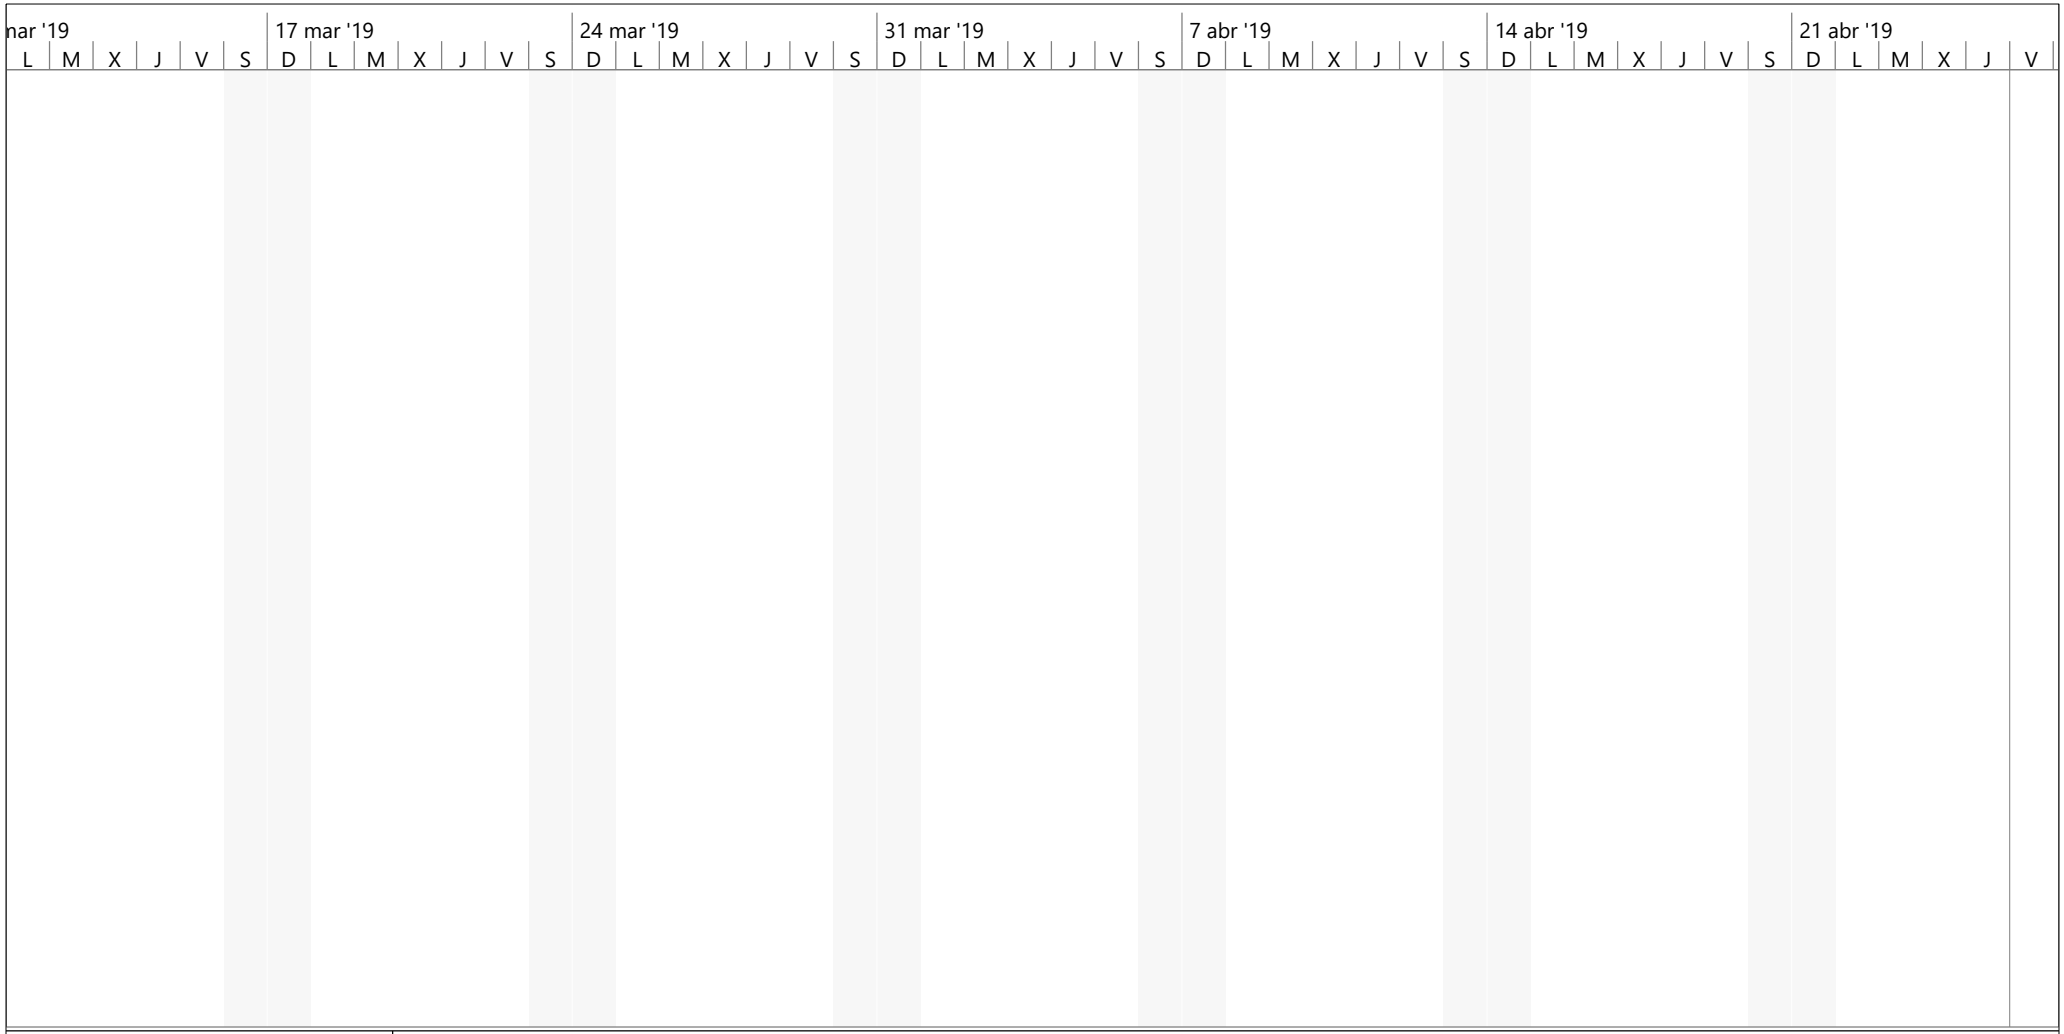

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

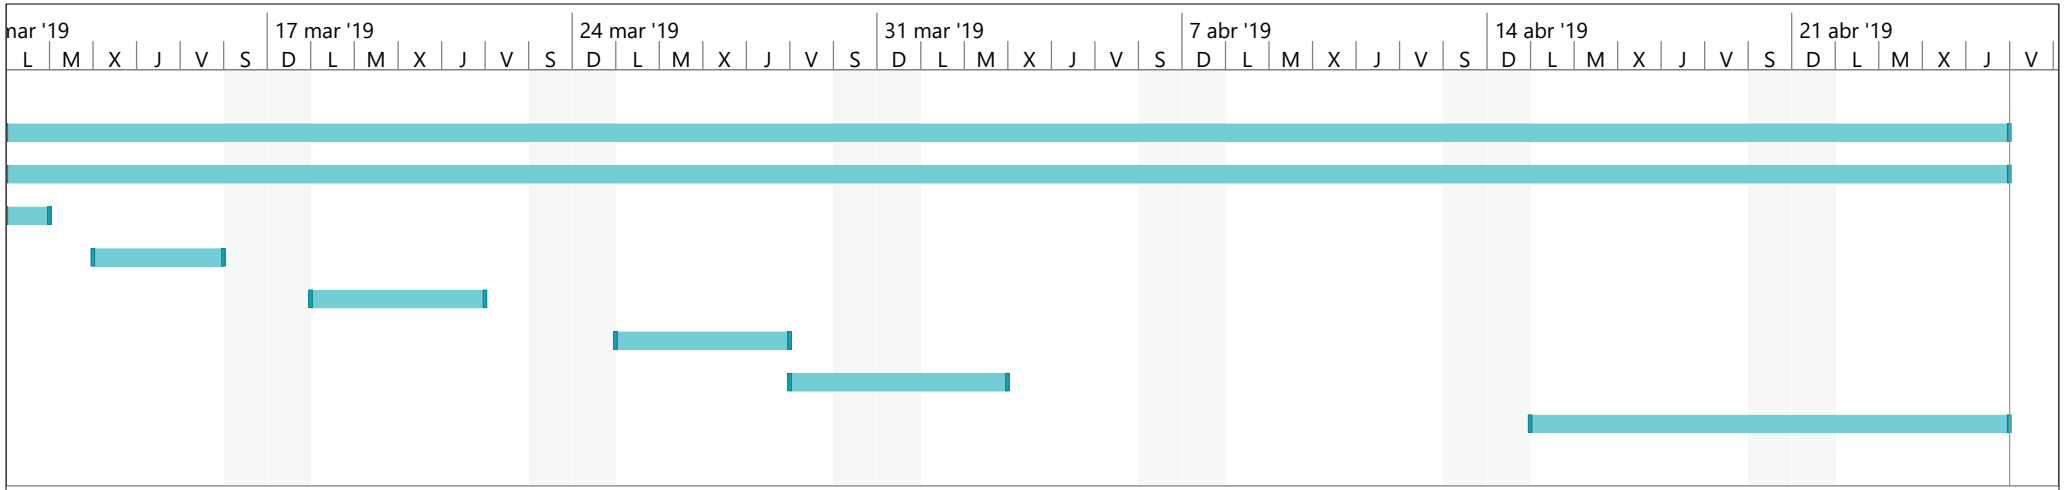

Proyecto: Proyecto1_Patto
Fecha: jue 22/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
